



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890030



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2015

REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE JUANA MOZA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE agosto DE 2015, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JAIME HUESCA GOMEZ, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO UNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. JAIME PEREZ BLANCO, C. JUDITH LEYVA SANCHEZ, Y C. FRANCISCO FRANCO CACERES.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	ZUMAYA CORPORACION FISCAL Y CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	SAN ANDRES TUXTLA 117, FRACC. PALMAS 93230; POZA RICA, VERACRUZ
R. F. C	ZCF-080804-SLO
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTOBAL, ADMINISTRADOR UNICO

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JUANA MOZA, DE LA LOCALIDAD DE JUANA MOZA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890030



DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2015301890030	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$166,734.58	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA 25 DE julio DE 2015	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA 23 DE agosto DE 2015	
NO. DE CONTRATO. DOP_2015301890030_FISM-DF_AD_011_C024	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
ANTICIPO.	NO APLICA		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 3320-02366-5	FECHA. 20 DE julio DE 2015	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$166,734.58	\$166,734.58	\$0.00	\$166,734.58	\$166,734.58	\$0.00

SALDO: \$ 0.00

RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
1 (UNO PARCIAL)	14 DE agosto DE 2015	\$100,850.08	\$100,415.38
2 (DOS) FINIQUITO	25 DE agosto DE 2015	\$65,884.50	\$65,600.52
	TOTAL	\$166,734.58	\$ 166,015.90



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890030



EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.



ING. MIGUEL PEDRO AIZCORBE SALICRUP.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.



C.P. DANIEL ZÚNIGA MAYA CRISTÓBAL
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. EDGAR JESUS MARTINEZ DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890030



ENTREGA

C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTOBAL
REPRESENTANTE LEGAL.

ARQ. EDGAR JESUS MARTINEZ DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAIME HUESCA GOMEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL

PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO

C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890030



POR EL COMITÉ COMUNITARIO.

* 

C. JAIME PEREZ BLANCO
PRESIDENTE

* 

C. JUDITH LEYVA SANCHEZ
SECRETARIO

* 

C. FRANCISCO FRANCO CACERES
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.














ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890030



FOTOGRAFIAS

AL INICIO

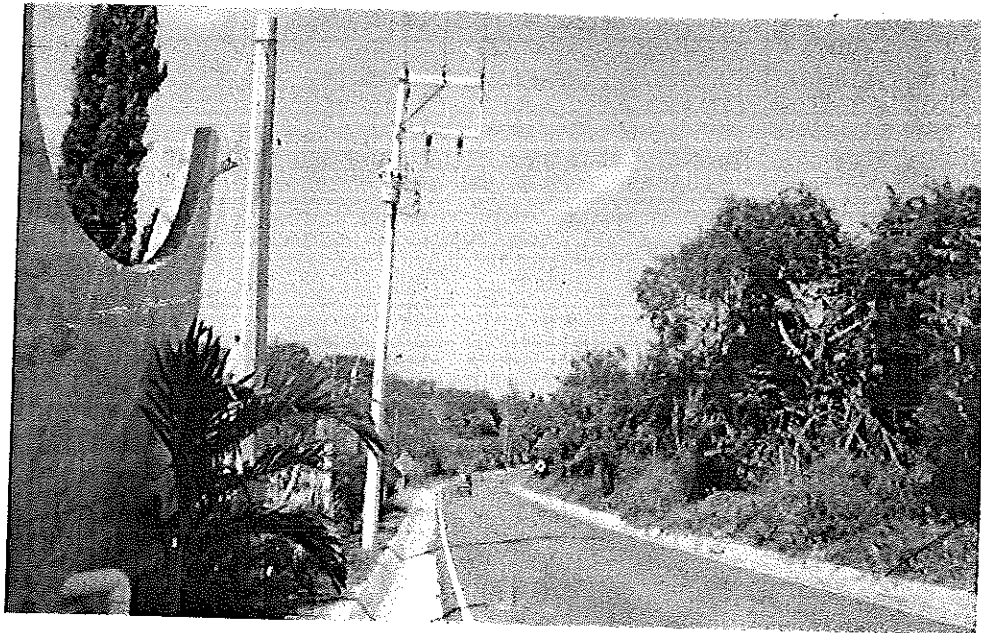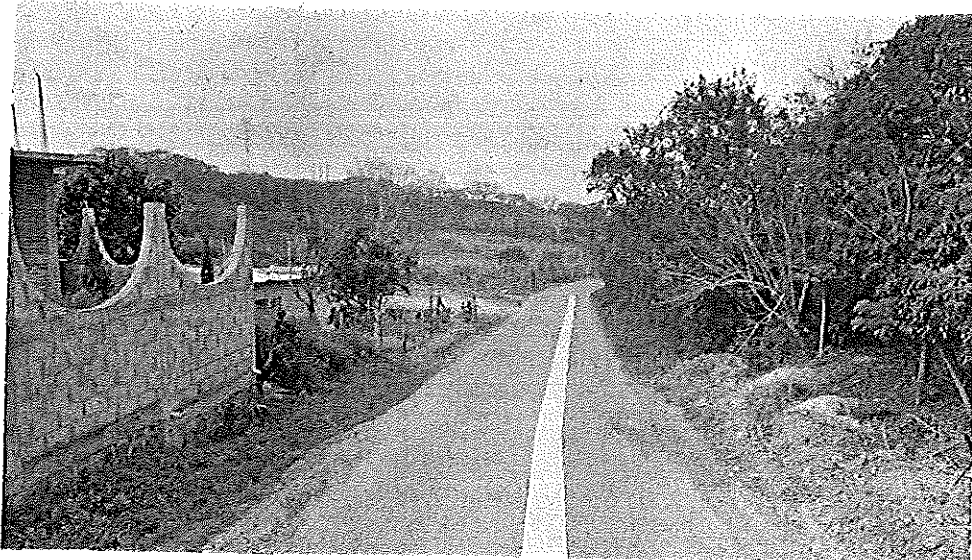

[Handwritten signature]
VOGAL

[Handwritten signature]
SECRE

[Handwritten signature]
PRES.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2015301890030

FORMATO 6

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

En la ciudad de POZA RICA, Ver., siendo las 11:00 HRS. del día 28 del mes de Diciembre de 2015, reunidos en las oficinas de CFE. Comparecen por una parte el **ING. ROBERTO SANTOS AQUINO**, en su carácter de Superintendente de la ZONA POZA RICA DIVISION DE DISTRIBUCION ORIENTE, por la otra parte el **LIC. JAVIER BENITEZ PONCE**, en su carácter de **SINDICO UNICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXPAN, VER.**, ambas partes de común acuerdo manifiestan haber cumplido fielmente las normas y procedimientos para la construcción de la obra "M-0166-15 AMP. R. D. Y B.T. EN COMUNIDAD JUANA MOZA" ubicada en el Municipio de TUXPAN, VER., la cual fue certificada bajo la supervisión del **ING. YAMID HERNANDEZ MARTINEZ**.

El **LIC. JAVIER BENITEZ PONCE** en su carácter de **SINDICO UNICO MUNICIPAL**, hace entrega física de las instalaciones correspondientes a la obra señalada en el párrafo anterior, mismas que fueron construidas, según proyecto aprobado mediante oficio No.O-1939-2015 de fecha 20 de Noviembre del 2015.

El señor **ING. ROBERTO SANTOS AQUINO**, en su carácter de representante de la CFE, recibe las instalaciones antes mencionadas, de acuerdo a inventario físico anexo, las cuales serán incorporadas al patrimonio de la CFE, de conformidad con el art. 9° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para realizar a través de las mismas, las funciones establecidas en los artículos 2do. Y 4to. De la Ley de la Industria Eléctrica vigente.

ENTREGA

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE
SINDICO UNICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TUXPAN, VER.

RECIBE

ING. ROBERTO SANTOS AQUINO
SUPTTE. DE ZONA POZA RICA

TESTIGO

C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTOBAL
CONTRATISTA.

TESTIGO

ING. ARMANDO MORALES HERNANDEZ
JEFE DEPARTAMENTO DISTRIBUCION



2015301890030
División de Distribución Oriente
Zona de Distribución Poza Rica
Departamento Planeación-Construcción

"2015 AÑO DEL GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"

Sección: Gerencia, División de Distribución Oriente.
Subsección: Zona Poza Rica. Depto. Planeación.
Serie: Liberación Exp. M-0166-15
Subserie: O-2103/2015
Asunto: Liberación de Obra Municipal

Poza Rica, Ver. A 28 de Diciembre de 2015.

**C.P. GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ
JEFE DEPTO. COMERCIAL ZONA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
P R E S E N T E:**

Por este medio le informamos que el servicio en baja tensión, colectiva y Rural, No existe inconveniente alguno por parte de este Departamento para que se proceda a la contratación para 07 servicios de la obra denominada "AMPLIACION DE R.D. Y B.T. CAMINO JUANA MOZA" Ubicada en la comunidad Juana Moza en el Municipio de Tuxpan, Ver; Toda vez que cumplió con las normas y especificaciones de Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo les solicito el RPU en cuanto les hagan su contratación.

Sin más por el momento, me despido de usted.

A T E N T A M E N T E



ING. SERGIO SERAFIN JIMÉNEZ

JEFE DEPTO. PLANEACION-CONSTRUCCION ZONA

C.c.p.- Ing. Yamid Hernández Martínez.-Jefe Ofna. Op. Y Manto. Tuxpan
C.c.p.- Expte. Obra.
SSJ'rgs'tgr



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:
DE FECHA:

DOP_2015301890030_FISM_DF_AD_011_C024
20 de julio de 2015

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER. Y POR
REPRESENTADO POR EL C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL

ZUMAYA CORPORACIÓN FISCAL Y CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.
EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAM, VER., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 24 de agosto de 2015
SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TUXPAM, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ.
CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE JUANA MOZA
-------------------------	---

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	25 de julio de 2015
FECHA DE INICIO REAL:	25 de julio de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	23 de agosto de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	23 de agosto de 2015
PLAZO EN DÍAS:	30
MONTO DEL CONTRATO:	\$166,734.58
MONTO DEL CONVENIO:	\$0.00
MONTO EJERCIDO:	\$166,734.58

LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA ABASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL PC-12-750	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE RECEPCION DE ACOMETIDAS	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDA	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RSA	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1K	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 3K	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2CCF2A	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS2N	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD2N/RD2	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR2A	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEJIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0	KG	104.61
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0	KG	21.94
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AEREAS	PZA	6.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AEREAS	PZA	6.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO OV15 CON BASE FOTOCELDA TUBO DE 1.20 MTS	PZA	2.00
EXTRAORDINARIOS		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AD30	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RD3N	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VA3N	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS3N	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA REA	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL PC-13-600	PZA	1.00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., FUERON LAS QUE SE RELACIONAN EN SEGUIDA:

No. DE ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO
EST 01		25 de julio de 2015	13 de agosto de 2015	\$100,850.08
EST 02		14 de agosto de 2015	23 de agosto de 2015	\$65,884.50
			TOTAL EJERCIDO (C/IVA)	\$166,734.58
			SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA	\$0.00
			MONTO CONTRATADO (C/IVA)	\$166,734.58

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER. DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.


QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I. V. A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA **EN TRÁMITE** POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADÉNDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.


EL **ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA EL DÍA 23 de agosto de 2015 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DE CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE ZUMAYA CORPORACIÓN FISCAL Y CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 24 de agosto de 2015 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA


C.P. DANIEL ZUMAYA CRISTÓBAL
ADMINISTRADOR ÚNICO
ZUMAYA CORPORACIÓN FISCAL Y CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.


ING. EDGAR J. MARTINEZ DIAZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO


ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP
DIRECTOR DE O. PÚBLICAS


ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRAS


C.P. HUMBERTO BENÍTEZ PÉREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
