



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890072



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.**  
**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2015**

REUNIDOS EN LA PRIVADA TORRES BODET DE LA COLONIA LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE diciembre DE 2015, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

**MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.**

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JULIO VELAZQUEZ CAPITAN, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, LIC. JULIA GUZMAN CASTAN Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE.

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO:**

C. ILDEFONSA RAMIREZ CASAREZ, C. GABRIEL CRUZ VALENTE, Y C. MARSELA GARCIA POSADAS.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	LAS PALMAS No.48 ALTOS, REVOLUCION MEXICANA 93997; PANUCO, VERACRUZ
R. F. C	PAS-140228-GJ1
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR, REPRESENTANTE LEGAL

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

**"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA TORRES BODET, DE LA COLONIA LOS PINOS, DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"**



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890072



### DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2015301890072	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$97,138.91	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA 10 DE noviembre DE 2015	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA 9 DE diciembre DE 2015	
NO. DE CONTRATO. DOP_2015301890072_FISM-DF_AD_020_C065	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.		
ANTICIPO.	\$ .00		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 001843AK0015	FECHA. 30 DE octubre DE 2015	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	

### INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$97,138.91	\$97,138.91	\$0.00	\$97,138.91	\$97,138.91	\$0.00

SALDO: \$ 0.00

### RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
1 (UNO) FINIQUITO	11 DE diciembre DE 2015	\$97,138.91	\$96,720.21
	TOTAL	\$97,138.91	\$96,720.21



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890072



EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.

  
\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL PEDRO AZCORBE SALICRUP.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. VICTOR MANUEL PARRA RAMIREZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS





Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

  
\_\_\_\_\_  
ING. E JOSHE JURADO AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890072




## ENTREGA

  
ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR  
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

## RECIBE

### MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

  
LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL


  
LIC. JULIO VELAZQUEZ CAPITAN.  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.  
TESORERO MUNICIPAL

  
LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.  
SINDICO UNICO MUNICIPAL

  
PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.  
REGIDOR PRIMERO

  
C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

  
LIC. JULIA GUZMAN CASTAN  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890072



POR EL COMITÉ COMUNITARIO.

C. ILDEFONSA RAMIREZ CASAREZ  
PRESIDENTE

C. GABRIEL CRUZ VALENTE  
SECRETARIO

C. MARSELA GARCIA POSADAS  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.



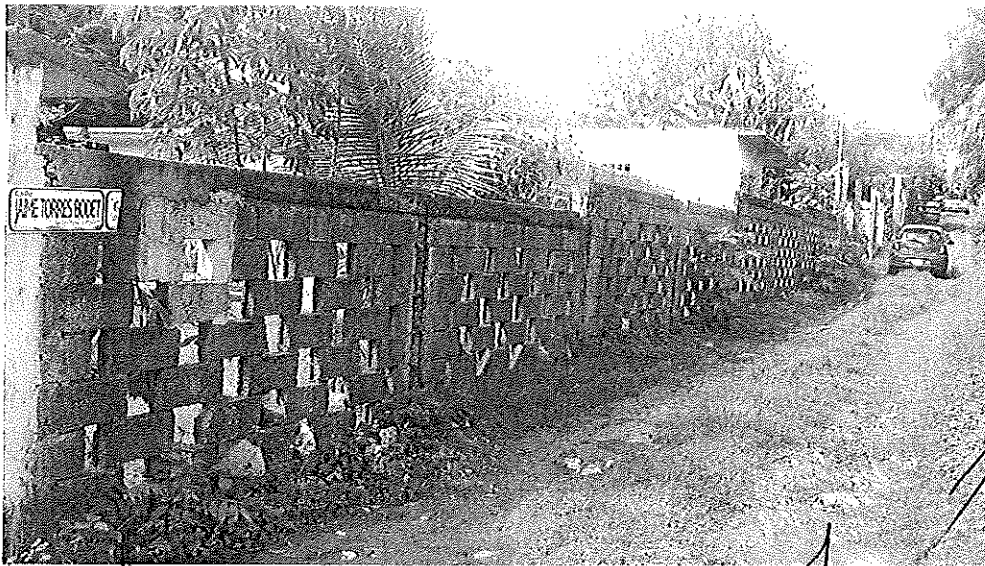
# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890072



## FOTOGRAFIAS

AL INICIO



FINAL



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:

DOP\_2015301890072\_FISM-DF\_AD\_020\_C065

DE FECHA:

30 de Octubre de 2015

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER. Y POR  
REPRESENTADO POR EL ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR

PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.  
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAM, VER., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 11 de Diciembre de 2015  
SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TUXPAM, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ.  
CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA TORRES BODET, DE LA COLONIA LOS PINOS
-------------------------	---

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	10 de Noviembre de 2015
FECHA DE INICIO REAL:	10 de Noviembre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	9 de Diciembre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	9 de Diciembre de 2015
PLAZO EN DÍAS:	30
MONTO DEL CONTRATO:	\$97,138.91
MONTO DEL CONVENIO:	
MONTO EJERCIDO:	\$97,138.91

LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	63.7500
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO; INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	31.8000
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO III HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO; INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	47.7000
PLANTILLA EN ZANJAS APISONADA AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	4.5000
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	42.0000
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO	M3	28.5000
CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES	M3	42.9000
ACARREO EN CAMION A KMS SUB-SECUENTES DE MATERIAL PETREO, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, TERRACERIA, LOMERIOSUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3-KM	171.6000
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 200 MMS.(8") DE DIAMETRO CON JUNTA DE HULE, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PUOT	ML	75.0000
POZO DE VISITA DE HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD DE 1.20 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR INFERIOR Y 0.60 MTS DE DIÁMETRO INTERIOR SUPERIOR, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CMS DE ESPESOR, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE 10 MTS A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150 KG/CM2, AGREGADO DE 19 MM, INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, CEMENTO, ARENA, GRAVA Y AGUA, EN REVENIMIENTO 12 A 15 CM, CON REVOLVEDORA, 1 SACO TROMPO, Y MANO DE OBRA PARA SU FABRICACIÓN, BAJAS RESISTENCIAS, APLANADO INTERIOR CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3, ESCALERA MARINA CON VRS DEL #5, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE ACARREOS FUERA DE LA OBRA DE MATERIALES SOBRIANTE.	PZA	2.0000





LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., FUERON LAS QUE SE RELACIONAN EN SEGUIDA:

No. DE ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO
EST 01 (FINIQUITO)		10 de Noviembre de 2015	9 de Diciembre de 2015	\$97,138.91
			TOTAL EJERCIDO (C/IVA)	\$97,138.91
			CONVENIO AMPLIACIÓN AL MONTO	
			MONTO AMPLIADO ( C/IVA)	\$97,138.91

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER. DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.


QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I. V. A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA **EN TRÁMITE** POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADÉNDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER.

EL **ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA EL DÍA Viernes, 14 de Agosto de 2015 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DE CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE **TIVATEC, S.A. DE C.V.**  
 REPRESENTADA POR EL **ING. ERNESTO UTRILLA ROSALES** EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER


CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 11 de Diciembre de 2015 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.


POR LA EMPRESA

  
 ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.

  
 ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR  
 RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

  
 ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP  
 DIRECTOR DE O. PÚBLICAS

  
 ARQ. VICTOR MANUEL PARRA RAMIREZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS

  
 C.P. HUMBERTO BENÍTEZ PÉREZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL
