



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890014



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2015

Vocal

REUNIDOS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA AMPLIACION LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE noviembre DE 2015, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JAIME HUESCA GOMEZ, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO UNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA, RESPECTIVAMENTE.

Secretario

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. CESAR CHONTAL MIXTEGA, C. SANTA ISABEL HERNANDEZ LICONA, Y C. YAZMIN SARAY CRUZ DE LA CRUZ.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	MOTOLINIA 126, CAZONES 93230; POZA RICA, VERACRUZ
R. F. C	CES-101208-1I9
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO, REPRESENTANTE LEGAL

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE DRÉN PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES HUERTA Y BENITO JUÁREZ, EN LA COL. AMP. LAS LOMAS, DE LA LOCALIDAD DE TÚXPAM DE RODRÍGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Presidente



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890014



DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2015301890014	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$1,662,308.47	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA 31 DE agosto DE 2015	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA 28 DE noviembre DE 2015	
NO. DE CONTRATO. DOP_2015301890014_FISM-DF_IR_022_C034	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
ANTICIPO.	\$498,692.54		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. 3900-01842-9	FECHA. 24 DE agosto DE 2015	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 3900-01843-2	FECHA. 24 DE agosto DE 2015	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$1,662,308.47	\$1,662,308.47	\$0.00	\$1,662,308.47	\$1,662,308.47	\$0.00

SALDO:	\$ 0.00
--------	---------

RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO	24 DE agosto DE 2015	\$0.00	\$498,692.54
1 (UNO PARCIAL)	1 DE octubre DE 2015	\$756,612.42	\$526,367.43
2 (DOS) FINIQUITO	1 DE diciembre DE 2015	\$905,696.05	\$630,083.38
TOTAL		\$1,662,308.47	\$1,655,143.35

VOCAL

SECRETARIO

PRESIDENTE



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890014



EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.





ING. MIGUEL PEDRO AZCORBE SALICRUP.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890014



ENTREGA

ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

Vocal

RECIBE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JAIME HUESCA GOMEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL

PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO

C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

SECRETARIO

PRESIDENTE



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890014



POR EL COMITÉ COMUNITARIO.

C. CESAR CHONTAL MIXTEGA
PRESIDENTE

C. SANTA ISABEL HERNANDEZ LICONA
SECRETARIO

C. YAZMIN SARAY CRUZ DE LA CRUZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890014




FOTOGRAFIAS

AL INICIO



FINAL

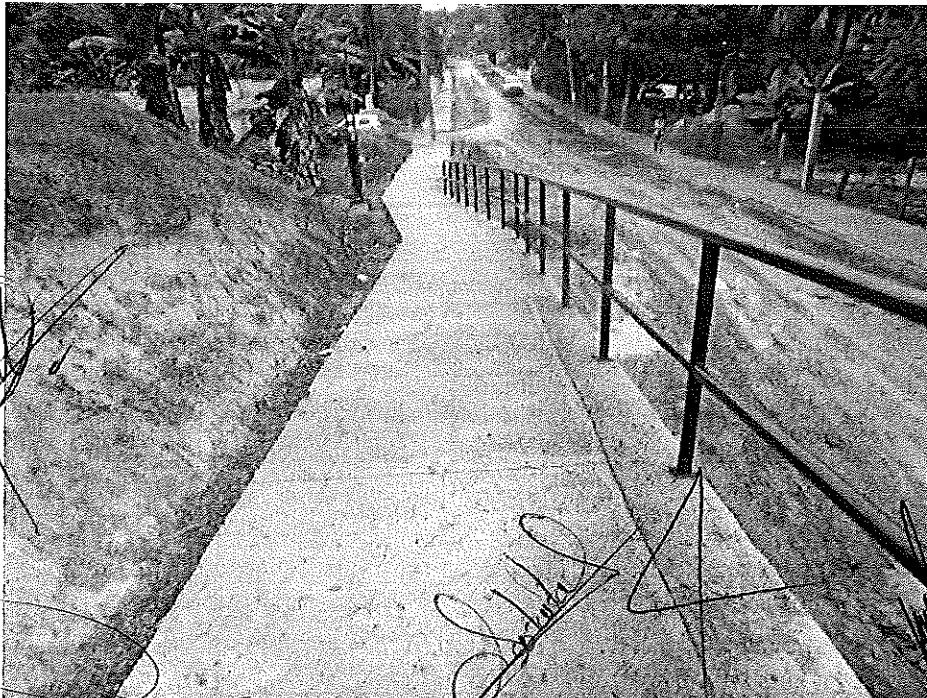

[Signature]
VOCAL

[Signature]
SECRETARIO

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



SUSSART

CONSTRUCTORA & EDIFICADORA S.A.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS QUE CONTRUCCIÓN SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:

DOP_2015301890014_FISM-DF_IR_022_C034

DE FECHA:

24 DE AGOSTO DEL 2015

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER. Y POR
REPRESENTADO POR EL ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DE C.V.
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAM, VER., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TUXPAM, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ.
CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.


LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES HUERTA Y BENITO JUAREZ, EN LA COL. AMP. LAS LOMAS
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	30 DE AGOSTO DEL 2015
FECHA DE INICIO REAL:	30 DE AGOSTO DEL 2015
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2015
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2015
PLAZO EN DÍAS:	90
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,662,308.47
MONTO DEL CONVENIO:	\$0.00
MONTO EJERCIDO:	\$1,662,308.47

LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

CLAVE	Descripción	UNIDAD	VOLUMEN
	DREN PLUVIAL		
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO DE 1" CON LONA DE 1.00X1.50 M. DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00 ✓
2	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CON RECUPERACION DE MATERIAL, CONSIDERANDO ACARREO DENTRO DE LA OBRA PARA SU AMONTONAMIENTO Y RESGUARDO	M2	260.00 ✓
3	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	405.77 ✓
4	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" DE DIAMETRO.	HR	62.00 ✓
5	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "II" EN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. PARA DESPLANTE DE TUBERIA TRASPALCO A LOS BORDOS DE LA ZANJA CONSIDERANDO AFINES DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	188.30 ✓
6	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "III" HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. PARA DESPLANTE DE TUBERIA; TRASPALCO A LOS BORDOS DE LA ZANJA CONSIDERANDO AFINES DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	150.64 ✓
7	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ROCA FUA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. PARA DESPLANTE DE TUBERIA; INCLUYE TRASPALCO A LOS BORDOS DE LA ZANJA CONSIDERANDO AFINES DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	37.66 ✓
8	PLANTILLA APISONADA DE 10 CMS. DE ESPESOR CONSIDERANDO MATERIALES TEPETATE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	36.18 ✓
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA ADS ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 15 Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	361.80 ✓



SUSOART

CONSTRUCTORA & EDIFICADORA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

CLAVE	Descripción	UNIDAD	VOLUMEN
10	CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL DE 1.30 X 1.00 Y 1.00 MTS. DE ALTO MEDIDAS INTERIORES Y 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CANTIDADES : 2.24 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2 52.89 KGS. DE VARILLAS DE 3/8", 11.68 M2 DE CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE Y 1.265 M3 , INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	14.00 ✓
11	CONSTRUCCION DE OBRA DE DESCARGA TIPO ALERO CON PARED DE 15 CM. DE ESPESOR CONSIDERANDO 1.95 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2, 38.06 KGS. DE VARILLA 3/8" LAS QUE SE COLOCARAN A @ 20 CM. EN AMBOS LADOS (PARRILLA SENCILLA), 12.37 M2 DE CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE, Y 1.21 M3 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, CONSIDERANDO MATERIALES ,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00 ✓
12	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA TIPO REGISTRO CON PARED DE 15 CM. DE ESPESOR CONSIDERANDO 1.95 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 KG/CM2, 35 KGS. DE VARILLA 3/8" LAS QUE SE COLOCARAN A @ 20 CM. EN AMBOS LADOS (PARRILLA SENCILLA), 9.6 M2 DE CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE, Y 1.00 M3 M3 DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, CONSIDERANDO MATERIALES ,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00 ✓
13	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	276.45 ✓
14	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3	147.10 ✓
15	ACARREO A KMS. SUB- SEC. EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM.	589.40 ✓
16	FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA DE 1.15 X 0.84 MTS, CONSIDERANDO CONTRAMARCO DE ANGULO ESTRUCTURAL DE ACERO A.36 DE 3"X3"X 1/4", MARCO Y REJILLA DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 5/16". CON SEPARACION LIBRE DE 4 CM, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE 100 DE COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	17.00 ✓
17	REPOSICION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CONSIDERANDO ACARREOS DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, INCLUYE AFINE Y COMPACTACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE BASE DE GRAVA DE 20 CMS. DE ESPESOR, RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS. / M2, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.7 LTS/M2 T IENDIDO DE CARPETA	M2	275.57 ✓
18	CONSTRUCCION DE TRINCHERA DE 1.00 X 1.00 X 0.15 MTS. MEDIDAS INTERIORES UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.00 MTS. CONSIDERANDO LAS SIG. CANTIDADES POR METRO LINEAL: 1.92 M3 DE EXCAVACION, 1.40 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, 49.28 KGS. DE VARILLA DE 3/8", 5.60 M2 DE CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE, Y 0.69 M3 DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2, CONSIDERANDO, RELLENOS, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE, LIMPIEZA DE LA OBRA, TAPA; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	5.98 ✓
GUARNICIONES Y BANQUETAS			
19	DESMONTE Y DESENRAICE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES HASTA 10 CM DE ESPESOR. INCLUYE CAPA VEGETAL	M2	786.62 ✓
20	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES Y BANQUETAS ACARREO DENTRO DE LA OBRA PARA SU AMONTONAMIENTO Y RESGUARDO RESGUARDO	M3	37.53 ✓
21	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	1,029.29 ✓
22	EXCAVACION A MANO EN CEPA CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN ZONA "A", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	381.85 ✓
23	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	M3	179.67 ✓
24	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM., INCLUYE: CIMBRADO CON FORMAS METALICAS Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX CALAFATEADA @ 15 M VIBRADO, CURADO, ACABADO A VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	411.13 ✓
25	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 25 X 80 CM., INCLUYE: CIMBRADO CON FORMAS METALICAS Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX CALAFATEADA @ 15 M VIBRADO, CURADO, ACABADO A VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	43.77 ✓
26	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS FRIAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.0	M2	786.65 ✓
27	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, TERRACERIA, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO	M3	311.63 ✓
28	ACARREO EN CAMION A KMS. SUBSECUENTES DE MATERIAL PETREO, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO. TERRACERIA, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO	M3-KM	1,246.52 ✓
MURO DE CONTENCION (concreto ciclopeo)			



SUSART

CONSTRUCTORA & EDIFICADORA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

CLAVE	Descripción	UNIDAD	VOLUMEN
29	TRAZO Y NIVELACIÓN EN EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	37.41
30	CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE EN MURO DE CONTENCIÓN DE 30 A 40 CMS. DE CORONA Y ANCHO DE BASE Y ALTURA VARIABLE HASTA 4.5 MTS. DE ALTURA LIBRE. CONSIDERANDO MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	135.53
31	SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO CICLOPEO EN MURO DE CONTENCIÓN DE 30 A 40 CMS. DE CORONA Y ANCHO DE BASE Y ALTURA VARIABLE HASTA 4.50 MTS. DE ALTO, CONSIDERANDO 60 % DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM2 Y 40 % DE PIEDRA, INCLUYE, MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	39.79
32	SUMINISTRO, HABILITADOY COLOCACION DRENES DE TUBO DE PVC DE 4" Y 3.00 MTS. DE LONGITUD COLOCADOS A TRESBOLILLO CON SEPARACION A CENTROS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	18.90
33	FILTRO DE PIEDRA QUEBRADA DE 25 CMS. DE ESPESOR UTILIZANDO PEDACERIA DE PIEDRA BRAZA CON TAMAÑO DE 3" A FINOS	M3	23.38
34	CONSTRUCCION DE BARANDAL DE TUBERIA DE FIERRO DE 2" CED. 40 POSTES @ 1.5 MT DE DISTANCIA, 1.00 M DE ALTURA PASAMANOS SUPERIOR Y TRABESAÑO @ 0.50 MT DE ALTURA, UNA MANO DE PRIMARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	33.58
35	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	1,472.38
EXT-01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	527.95
EXT-02	RELLENO APISONADO DE 10 CMS. DE ESPESOR CONSIDERANDO MATERIAL TEPETATE EN AREA DE BANQUETAS Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	60.96
EXT-03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLL DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	710.06

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., FUERON LAS QUE SE RELACIONAN EN SIGUIENDA:

No. DE ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO
EST 01 (UNO PARCIAL)		31/08/2015	30/09/2015	\$ 756,612.42
EST 02 (DOS FINIQUITO)		01/10/2015	28/11/2015	\$ 905,696.05
			TOTAL EJERCIDO (C/IVA)	\$ 1,662,308.47
			SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA	\$ -
			MONTO CONTRATADO (C/IVA)	\$ 1,662,308.47

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER. DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I. V. A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA **EN TRÁMITE** POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADÉNDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER.

EL **ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA EL DÍA **28 DE NOVIEMBRE DEL 2015** QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DE CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.



SUSSART

CONSTRUCTORA & EDIFICADORA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

POR SU PARTE **CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DE C.V.**

REPRESENTADA POR EL
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO

, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER

EN SU CALIDAD DE

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA
LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

POR LA EMPRESA

ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA SARMIENTO

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SUSSART, S.A. DE C.V.

ARQ. ALEJANDRO SUSTAITA
SARMIENTO

RESIDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ARQ. JUAN AMNEL ROMERO CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRAS

C. P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
