



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890024



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.**  
**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS MDF) 2015**

REUNIDOS EN LA CALLE HINOJOSA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE agosto DE 2015, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

**MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.**

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JAIME HUESCA GOMEZ, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE.

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO:**

C. JUAN OLAN ORTIZ, C. ANA LUISA CARBAJAL MONTES, Y C. PEDRO RAMIREZ TREJO.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	COTEYMA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	UNO 35-A, JESUS REYES HEROLES 92810; TUXPAN, VERACRUZ
R. F. C	COT-090709-DM8
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ, ADMINISTRADOR UNICO

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HINOJOSA, ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON A POTRERO, LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"**



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890024



## DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA <b>2015301890024</b>	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$1,897,566.74	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA <b>1 DE julio DE 2015</b>	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA <b>14 DE agosto DE 2015</b>	
NO. DE CONTRATO. <b>DOP_2015301890024_FISM-DF_IR_005_C008</b>	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: <b>AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.</b>		
ANTICIPO.	<b>\$569,270.02</b>		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. <b>4094-02685-2</b>	FECHA. <b>26 DE junio DE 2015</b>	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. <b>4094-02686-9</b>	FECHA. <b>26 DE junio DE 2015</b>	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO. <b>NO APLICA</b>	FECHA. <b>NO APLICA</b>	

## INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$1,897,566.74	\$1,897,566.74	\$0.00	\$1,897,566.74	\$1,897,566.74	\$0.00

<b>SALDO:</b>	<b>\$ 0.00</b>
---------------	----------------

## RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO	26 DE junio DE 2015	\$0.00	\$569,270.02
1 (UNO PARCIAL)	31 DE agosto DE 2015	\$1,512,027.91	\$1,051,902.18
2 (DOS) FINIQUITO	10 DE septiembre DE 2015	\$385,538.83	\$268,215.37
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1,897,566.74</b>	<b>\$1,889,387.57</b>



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890024



EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.

ING. MIGUEL PEDRO AIZCORBE SALICRUP.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ANSELMO MEZA HERNANDEZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ  
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890024



## ENTREGA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ  
REPRESENTANTE LEGAL.

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
ARQ. JULIO CESAR RODRIGUEZ SIERRA  
RESIDENTE DE OBRA

## RECIBE

### MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
LIC. JAIME HUESCA GOMEZ.  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.  
TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.  
SINDICO UNICO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.  
REGIDOR PRIMERO

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890024





POR EL COMITÉ COMUNITARIO.

  
C. JUAN OLAN ORTIZ  
PRESIDENTE


  
C. ANA LUISA CARBAJAL MONTES  
SECRETARIO


  
C. PEDRO RAMIREZ TREJO  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.













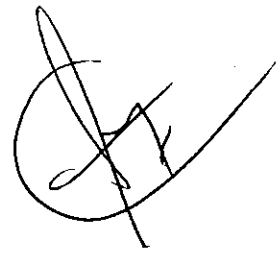













# ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890024



## FOTOGRAFIAS.

AL INICIO



AL FINAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# COTEYMA S.A. DE C.V.

RFC. COT-090709-DM8  
 CALLE UNO 35 A COL. JESUS REYES HEROLES  
 TUXPAM, VERACRUZ  
 C.P. 92810

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP_2015301890024_FISM-DF_IR_005_C008
DE FECHA:	26 de junio de 2015

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER. Y POR  
 REPRESENTADO POR EL ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ

COTEYMA, S.A DE C.V.  
 EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAM, VER., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA **17 DE AGOSTO DE 2015**  
 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TUXPAM, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ.  
 CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA  
**ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HINOJOSA, ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON A POTRERO, LOCALIDAD DE SANTIAGO DE LA PEÑA.
-------------------------	---

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	1 DE JULIO DE 2015
FECHA DE INICIO REAL:	1 DE JULIO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	14 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	14 DE AGOSTO DE 2015
PLAZO EN DÍAS:	45
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,897,566.74
MONTO DEL CONVENIO:	\$0.00
MONTO EJERCIDO:	\$1,897,566.74

LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

CLAVE	Descripción	UNIDAD	VOLUMEN
1	PAVIMENTO		
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO ZINTRO GALV. DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
3	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,634.78
4	CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II EN SECO EN ZONA "D" HASTA ALCANZAR NIVEL SUBRASANTE, INCLUYE: OPERACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3	804.98
5	AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MEDIOS MECÁNICOS INCLUYE RIEGO DE AGUA HASTA EL GRADO ÓPTIMO DE HUMEDAD.	M2	2,634.78
6	SUMINISTRO, ACARREO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE 1-1/2" A FINOS TOTALMENTE TRITURADA, DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE, INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA MAQUINARIA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	526.01
7	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 CON GRAVA TRITURADA T.M.A. 1 1/2" DIAM. Y ARENA GRUESA TM 3/8" DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, ACABADO ESCOBILLADO GRUESO SOBRE LA SUPERFICIE, CURADO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, JUNTAS DE DILATACIÓN CON VARILLA LISA (COLD-ROLL) DEL	M2	2,627.66
8	NIVELACIÓN DE BROCAL DE POZO DE VISITA DE TADIQUE 7 X 14 X 28 CM. A TIZÓN HASTA 45 CM. DE ALTURA, INCLUYE. RETIRO Y REPOSICIÓN NUEVA DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: JUNTA EN FORMA DE DIAMANTE PARA AISLAMIENTO CON CELOTEX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	4.00
9	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILÓMETRO DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, TERRACERIA, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO	M3	1,046.47
10	ACARREO EN CAMIÓN A KMS. SUBSECUENTES DE MATERIAL PÉTREO, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO, TERRACERIA, LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO	M <sup>3</sup> -KM	4,185.88
11	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	159.40
12	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	2,634.78



# COTEYMA S.A. DE C.V.

RFC: COT-090709-DM8  
 CALLE UNO 35 A COL. JESUS REYES HERODES  
 TUXPAN, VERACRUZ  
 C.P. 92810

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

CLAVE	Descripción	UNIDAD	VOLUMEN
<b>REHABILITACION DE AGUA POTABLE</b>			
13	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	83.80
14	CORTE EN PAVIMENTO CON DISCO DE DIAMANTE	ML	16.60
15	EXCAVACION EN ROCA FIJA PIZANJAS, EN SECO EN ZONA "A" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD., INCLUYE LA NIVELACION DEL FONDO Y AFINE DE LA CEPA.	M3	86.39
16	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO AL 90% PROCTOR	M3	14.40
17	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	M3	8.40
18	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	M3	77.99
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL DE 75 MM. DE DIAM., INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA	ML	120.00
20	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DIAM. EN RED HIDRAULICA DE 3" DE PVC S.I., INCLUYE ABRAZADERA, CONECTOR, POLIDUCTO KITEC O SIMILAR, NIPLE DE 0.60M. DE FO. GALV. CON VALVULA 1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	TOMA	7.00
21	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAMION CON TIRO LIBRE (CARGA MANUAL)	M3	18.72
22	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, VIBRADO Y CURADO DE F'C= 150 kg/cm2 (OBRA CIVIL ATRAQUES).	M3	0.08
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SISTEMA INGLES, CODO DE 22'30" DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.	PZA	1.00
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SISTEMA INGLES, COPL DE REPARACION DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.	PZA	1.00
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SISTEMA INGLES, TAPON CAMPANA DE 76 MM (3") DE DIAMETRO.	PZA	1.00
<b>EXTRAORDINARIOS</b>			
<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>			
EXT-1	TRAZO Y NIVELACION PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIMEROS 10,000 M2.	M2	15.40
EXT-2	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO	M3	3.08
EXT-3	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM., INCLUYE: CIMBRADO CON FORMAS METALICAS Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX CALAFATEADA @ 15 M VIBRADO, CURADO, ACABADO A VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	ML	10.55
EXT-4	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS FRIAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.0	M2	13.82
<b>COMPLEMENTARIAS</b>			
EXT-5	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO A PRIMERA ESTACION Y APILE DEL MATERIAL.	M2	11.50
EXT-6	APERTURA DE CUNETAS EN TRAMOS AISLADOS CON TALUDES DE 2:1	ML	80.0049
EXT-7	AFINE DE TERRACERIA Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: COMPACTACION SIN CONTROL DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	579.08





# COTEYMA S.A. DE C.V.

RFC. COT-090709-DM8  
CALLE UNO 35 A COL. JESUS REYES HEROLES  
TUXPAM, VERACRUZ  
C.P. 92810

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., FUERON LAS QUE SE RELACIONAN EN SEGUIDA:				
No. DE ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO
EST 01 (UNO)		1 de Julio de 2014	8 DE AGOSTO DE 2014	\$1,512,027.91
EST 02 (DOS)		9 DE AGOSTO DE 2014	14 DE AGOSTO DE 2014	\$385,538.83
FINIQUITO				
			<b>TOTAL EJERCIDO (C/IVA)</b>	<b>\$1,897,566.74</b>
			<b>SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>MONTO CONTRATADO ( C/IVA)</b>	<b>\$1,897,566.74</b>

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER. DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.


QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I. V. A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA **EN TRÁMITE** POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADÉNDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER.

EL **ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA EL DÍA **14 DE AGOSTO DE 2015** QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DE CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE **COTEYMA, S.A DE C.V.**  
REPRESENTADA POR EL **ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ** EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER


CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA **17 DE AGOSTO DE 2015** LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.


POR LA EMPRESA


  
\_\_\_\_\_  
ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
COTEYMA, S.A DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ  
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO

  
\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP  
DIRECTOR DE O. PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. ANSELMO MEZA HERNANDEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

  
\_\_\_\_\_  
C.P HUBERTO BENITEZ PÉREZ  
CONTRALOR MUNICIPAL
