



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890050



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FIS MDF) 2015

REUNIDOS EN LA CALLE MANGO CRIOLLO DE LA COLONIA LOS MANGOS DE LA LOCALIDAD DE ALTO
LUCERO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE octubre DE 2015,
REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JAIME HUESCA GOMEZ, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. ATENAS GRACIELA RAMIREZ DIEGO, C. MARIA LUISA MARTINEZ VAZQUEZ, Y C. LUIS IRENE REYES ZUL.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	LAS PALMAS No.48 ALTOS, REVOLUCION MEXICANA 93997, PANUCO, VERACRUZ
R. F. C	PAS-140228-GJ1
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR, REPRESENTANTE LEGAL

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE MANGO CRIOLLO A LA CALLE MANGO MANILA, DE LA COLONIA LOS MANGOS, DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Handwritten notes:
VOCAL
more info
SANCHEZ
ATENAS GRACIELA
PRESIDENTE

Handwritten signatures and marks:
Large signature at top right.
Signature over the members list.
Signature over the committee list.
Signature over the contractor table.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890050



DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2015301890050	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$475,016.95	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA 25 DE septiembre DE 2015	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA 24 DE octubre DE 2015	
NO. DE CONTRATO. DOP_2015301890050_FISM-DF_IR_027_C039	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.		
ANTICIPO.	NO APLICA		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 001630AK0015	FECHA. 18 DE septiembre DE 2015	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$475,016.95	\$475,016.95	\$0.00	\$475,016.95	\$475,016.95	\$0.00

SALDO:	\$ 0.00
--------	---------

RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO	NO APLICA	\$0.00	\$0.00
1 (UNO PARCIAL)	15 DE octubre DE 2015	\$251,187.32	\$250,104.62
2 (DOS) FINIQUITO	27 DE octubre DE 2015	\$223,829.63	\$222,864.85
	TOTAL	\$475,016.95	\$ 472,969.47



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890050



EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.




ING. MIGUEL PEDRO AIZCORBE SALICRUP.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.




ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.


EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...


VOCAL


SECRETARIO


PRESIDENTE





ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890050



ENTREGA

[Handwritten signature]
VOCAL

[Handwritten signature]
ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

[Handwritten signature]
SECRETARIO

[Handwritten signature]
LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
LIC. JAIME HUESCA GOMEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]
C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO

[Handwritten signature]
C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Handwritten signature]
C.P. HUMBERTO BENITEZ PEREZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890050



POR EL COMITÉ COMUNITARIO.

Atenas GRD.
Atenas Graciela Ramirez Diego
C. ATENAS GRACIELA RAMIREZ DIEGO
PRESIDENTE

Maria Luisa
Luzo
C. MARIA LUISA MARTINEZ VAZQUEZ
SECRETARIO

[Signature]
C. LUIS IRENE REYES ZUL
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2015301890050




FOTOGRAFIAS

AL INICIO



FINAL

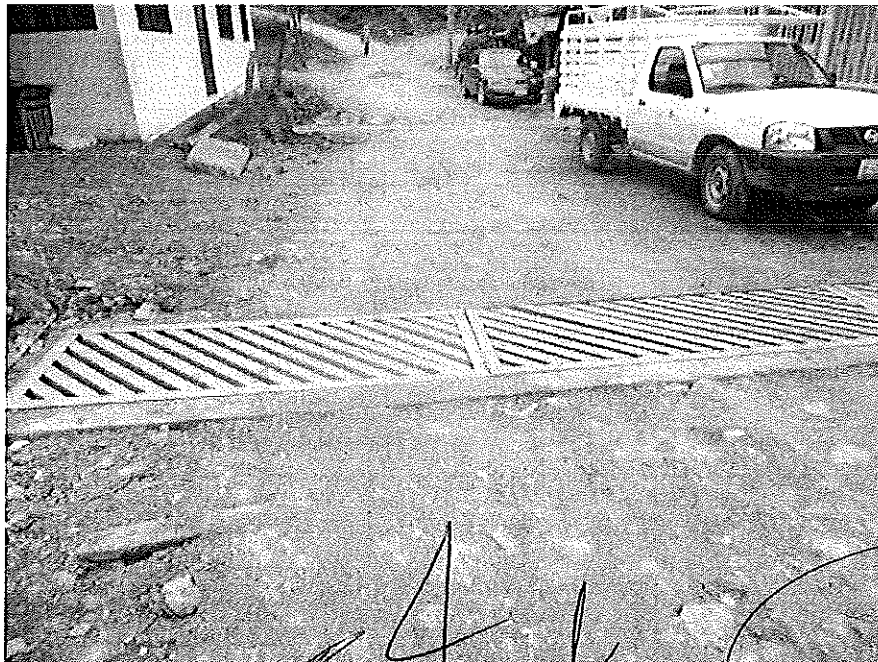

[Handwritten signature]
VOCAL

[Handwritten signature]
SECRETARIO

[Handwritten signature]
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]
[Large handwritten signature]

todos somos



H. Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPENDENCIA: H. Ayuntamiento
SECCIÓN: Obras Públicas
MESA: Dirección
OFICIO No. DOP/0083/2016
ASUNTO: El que se indica

RECIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
24 JUN 2016
HORA: 12:00 hr

ACUSE

LIC. JAVIER BENÍTEZ PONCE
SÍNDICO
TUXPAN, VERACRUZ
PRESENTE.

A TRAVEZ DEL PRESENTE INFORMAMOS A USTED, QUE DE ACUERDO A LA RELACIÓN AQUÍ DETALLADA, ESTAS OBRAS, PASAN A FORMAR PARTE DEL INVENTARIO DE DRENES PLUVIALES Y ZANJAS, A LOS CUALES EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER., A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y SERVICIO, PROPORCIONA EL MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA PERIÓDICA CADA AÑO.

Table with 3 columns: OBRA, DESCRIPCIÓN, OBSERVACIONES. Contains 3 rows of project details including drainage systems in various streets.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Tuxpan, Ver., a 22 de Junio del año 2016.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CÉSAR MANUEL JUÁREZ CHIMAL

RECIBIDO
CONTRALORIA
24 JUN 2016
HORA: 1:53 hrs

RECIBIDO
SINDICO MUNICI
24 JUN 2016
HORA: 11:59

c.c.p. LIC. RAÚL ALBERTO RUIZ DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.-PARA SU CONOCIMIENTO
c.c.p. LIC. ANA ALICIA PÉREZ DÍAZ; CONTRALOR MUNICIPAL.-PARA SU CONOCIMIENTO
c.c.p. Archivo.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:

DOP_2015301890050_FISM-DF_IR_027_C039

DE FECHA:

18 de Septiembre de 2015

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER. Y POR

REPRESENTADO POR EL

ING. E JOSHUE JURADO AGUILAR

PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.

EN SU CARÁCTER DE

REPRESENTANTE LEGAL

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAM, VER., SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA

26 de Octubre de 2015

SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TUXPAM, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ. CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CALLE MANGO CRIOLLO A LA CALLE MANGO MANILA, DE LA COLONIA LOS MANGOS.
-------------------------	---

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	25 de Septiembre de 2015
FECHA DE INICIO REAL:	25 de Septiembre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	24 de Octubre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	24 de Octubre de 2015
PLAZO EN DÍAS:	30
MONTO DEL CONTRATO:	\$475,016.95
MONTO DEL CONVENIO:	
MONTO EJERCIDO:	\$475,016.95

LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METALICO TUBULAR ZINTRO GALV. 1" CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO INTEGRADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.0000
DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACION DE ACERO, PARA ENLACE DE DESCARGA PLUVIAL TIPO TRINCHERA CONSIDERANDO UNA SUPERFICIE DE 1.40 X 1.30 M Y 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, RESANES Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	1.0000
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	113.2100
BOMBEO DE ÁCHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" DE DIAMETRO.	HR	34.0000
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "II" EN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. PARA DESPLANTE DE TUBERIA TRASPALO A LOS BORDOS DE LA ZANJA CONSIDERANDO AFINES DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	103.3300
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "III" HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. PARA DESPLANTE DE TUBERIA; INCLUYE TRASPALO A LOS BORDOS DE LA ZANJA CONSIDERANDO AFINES DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	82.6600
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ROCA FIJA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0 A 2.00 MTS. PARA DESPLANTE DE TUBERIA; INCLUYE TRASPALO A LOS BORDOS DE LA ZANJA CONSIDERANDO AFINES DE FONDO Y TALUDES, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	20.6700
PLANTILLA APISONADA DE 10 CMS. DE ESPESOR CONSIDERANDO MATERIAL TEPETATE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	6.6100
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA ADS ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 15 Ø, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	94.4800

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL DE 1.30 X 1.00 Y 1.00 MTS. DE ALTO MEDIDAS INTERIORES Y 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CANTIDADES : 2.24 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2, 52.89 KGS. DE VARILLAS DE 3/8", 11.68 M2 DE CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE Y 1.265 M3 , INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3.0000
CONSTRUCCION DE OBRA DE DESCARGA TIPO TRINCHERA TRIANGULAR CON PARED DE 15 CM. DE ESPESOR CONSIDERANDO 1.95 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2, 38.06 KGS. DE VARILLA 3/8" LAS QUE SE COLOCARAN A @ 20 CM. EN AMBOS LADOS (DOBLE SENCILLA), 8.91 M2 DE CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE Y 1.21 M3 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, CONSIDERANDO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000
CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA TIPO TRINCHERA RECTANGULAR CON PARED DE 15 CM. DE ESPESOR CONSIDERANDO 1.10 M2/ML DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2, 42.09 KGS./ML DE VARILLA 3/8" LAS QUE SE COLOCARAN A @ 20 CM. EN AMBOS LADOS (PARRILLA DOBLE), 5.09 M2/ML DE CIMBRA COMUN ACABADO NO APARENTE, Y 0.53 M3/ML DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, CONSIDERANDO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	14.0000
RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO.	M3	163.5400
CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3	42.4600
CARGA Y ACARREO A KMS. SUB- SEC. EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	169.8400
FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA DE 1.15 X 0.84 MTS, CONSIDERANDO CONTRAMARCO DE ANGULO ESTRUCTURAL DE ACERO A.36 DE 3"X 1/4", MARCO Y REJILLA DE ANGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 5/16", CON SEPARACION LIBRE DE 4 CM, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE ESMALTE 100 DE COMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	14.9200
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	113.2100
POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 3 MTS DE PROFUNDIDAD DE 0.28 CM DE ESPESOR CON TABIQUE 7X14X28 A TIZÓN, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5, APLANADO INTERIOR CON MEZCLA CEM-ARENA 1:5 HASTA 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.0000
DESALME DE TERRENO HASTA 20 CMS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO EN TERRENO TIPO II CONSIDERANDO ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL PARA SU ACARREO	M2	726.8800
CARGA Y ACARREO A KMS. SUB- SEC. EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3	188.9900
ACARREO A KMS. SUB-SEC. EN CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM.	377.9800
AFINE Y COMPACTACION AL 90% DEL TERRENO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS, INCORPORANDO LA HUMEDAD NECESARIA	M2	726.8800
SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE BASE DE GRAVA SELECCIONADA DE 1 1/2" DE DIAMETRO DEL BANCO EL OJITE, DE 15 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR	M2	145.3800
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	726.8800

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., FUERON LAS QUE SE RELACIONAN EN SIGUIENTE:

No. DE ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO
EST 01		25 de Septiembre de 2015	25 de Septiembre de 2015	\$251,187.32
EST 02 (FINIQUITO)		16 de Octubre de 2015	24 de Octubre de 2015	\$223,829.63
			TOTAL EJERCIDO (C/IVA)	\$475,016.95
			CONVENIO AMPLIACIÓN AL MONTO	
			MONTO AMPLIADO (C/IVA)	\$475,016.95

LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER. DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I. V. A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA **EN TRÁMITE** POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADÉNDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER.

EL **ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP**, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA EL DÍA Viernes, 14 de Agosto de 2015 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DE CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE **TIVATEC, S.A. DE C.V.**
 REPRESENTADA POR EL **ING. ERNESTO UTRILLA ROSALES** EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER


CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 26 de Octubre de 2015
 LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA


 ING. E. JOSHUE JURADO AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL
 PROYECTOS ASTORGA, S.A. DE C.V.


 ING. E. JOSHUE JURADO AGUILAR
 RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO


 ING. MIGUEL AIZCORBE SALICRUP
 DIRECTOR DE O. PÚBLICAS


 ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS
 SUPERVISOR DE OBRAS


 C.P. HUMBERTO DE HÍDEZ PÉREZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
