



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890007



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
EJERCICIO FISCAL 2016

REUNIDOS EN LA CALLE DEL PUENTE DE LA COLONIA LAS DELICIAS, LOCALIDAD DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 6 DE octubre DE 2016, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ, C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. BEATRIZ GARCÉS ESCOBAR, C. ROSA GARCIA PACHECO, Y C. RAUL LARA VICENTE.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	COTEYMA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	UNO 35-A, JESUS REYES HEROLES 92810; TUXPAN, VERACRUZ
R. F. C	
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ, ADMINISTRADOR UNICO

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DEL PUENTE ENTRE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLE DEL POZO DE LA COLONIA LAS DELICIAS, DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Raúl Lara Vicente



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890007



DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2016301890007	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$465,154.84	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL. DD/MM/AA 19 DE agosto DE 2016	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL. DD/MM/AA 2 DE octubre DE 2016	
CONVENIO DE AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO: \$67,627.45	IMPORTE TOTAL DE LA OBRA: \$532,782.29		
REPROGRAMACION DE CONVENIOS DE DIFERIMIENTO Y AMPLIACION AL PLAZO	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA NO APLICA	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA NO APLICA	
NO. DE CONTRATO. DOP_2016301890007_FISMDF__AD_006_C029	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA		
ANTICIPO.	\$139,546.45		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. 4094-03244-0	FECHA. 17 DE agosto DE 2016	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 4094-03245-9	FECHA. 17 DE agosto DE 2016	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO.	FECHA.	

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$537,490.73	\$537,490.73	\$ 0.00	\$532,782.29	\$532,782.29	\$ 0.00

SALDO: \$4,708.44

Raúl Lara Vicente



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890007



RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO	17 DE agosto DE 2016	\$ 0.00	\$139,546.45
1 (UNO) PARCIAL	14 DE septiembre DE 2016	\$403,415.88	\$280,652.26
2 (DOS) PARCIAL		\$ 0.00	\$ 0.00
3 (TRES) PARCIAL		\$ 0.00	\$ 0.00
4 (CUATRO) PARCIAL		\$ 0.00	\$ 0.00
(FINIQUITO)	03 DE octubre DE 2016	\$129,366.41	\$110,287.11
	TOTAL	\$532,782.29	\$530,485.82

EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. VICTOR MANUEL PARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL Y/O
RESIDENTE DE OBRA

Raúl Lara Vicente



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890007




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL **CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO** QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

ENTREGA




ING. AGUSTIN MENDEZ Y ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL Y/O
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.



LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


Raúl Lara Vicente




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890007




C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL


PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO



C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO.


C. BEATRIZ GARCÉS ESCOBAR
PRESIDENTE


C. ROSA GARCÍA PACHECO
SECRETARIO


C. RAUL LARA VICENTE
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890007



FOTOGRAFIAS AL INICIO DE LA OBRA

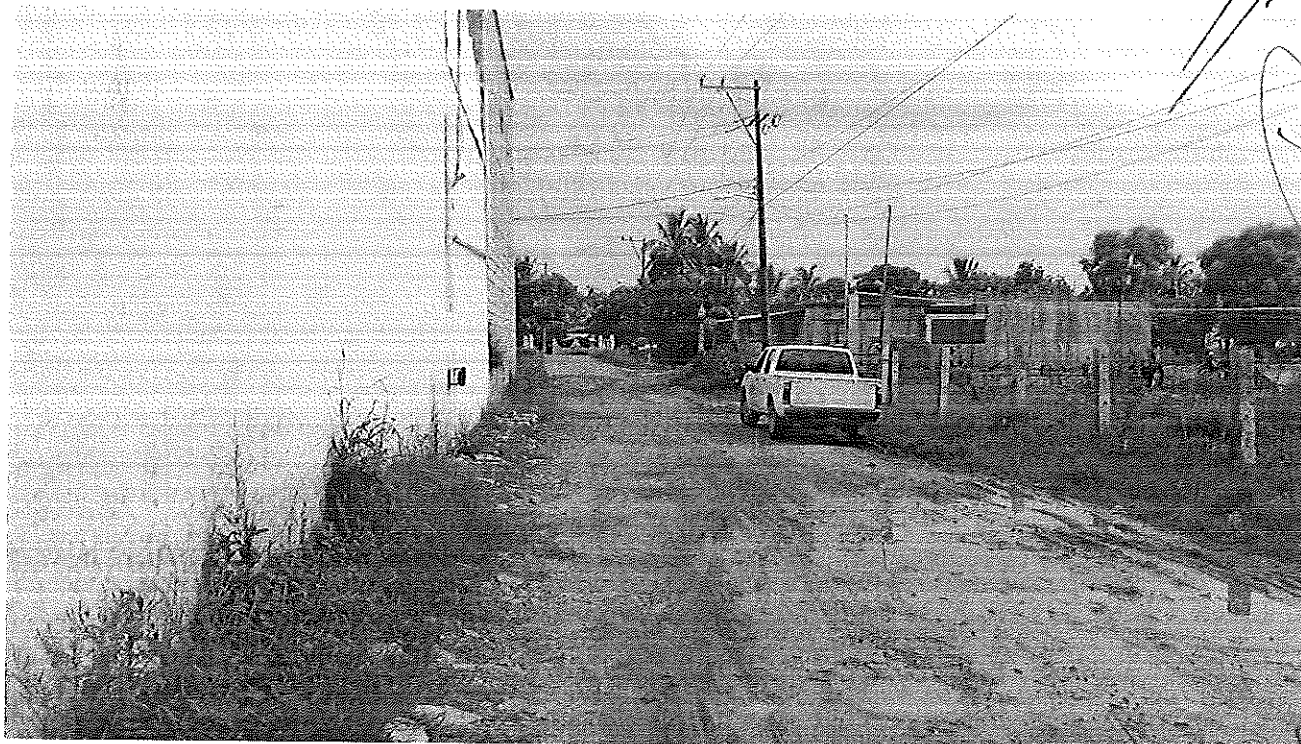

[Firma]

[Firma]

4 Raúl Lara Vicente

Beatriz Gt




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890007



FOTOGRAFIAS

AL TERMINO DE OBRA

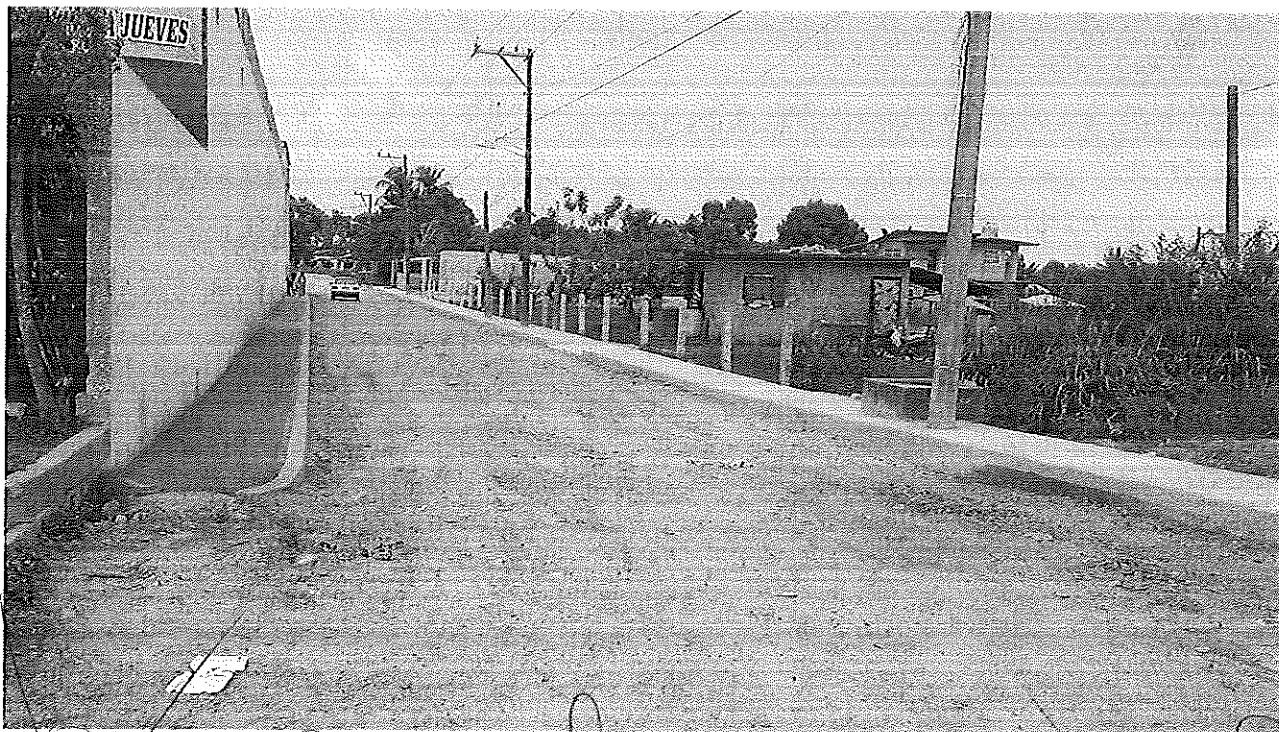

[Firma]
Beatriz G.E.

[Firma]
Raul Lara Vicente

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

DOMICILIO
C DESIDERIO 28
COL LAS DELICIAS 92883
TUXPAN VER.

FECHA DE NACIMIENTO
19/08/1977



ESTADO JU MUNICIPIO 100 SECCION 4140
LOCALIDAD 0001 EMISSION 2014 VIGENCIA 2021

REGISTRO 1897 01

IFE

Beatriz G.F.

IDMEX1129222340<<4140065488482
7708198M2412311MEX<01<<03204<2
GARCES<ESCOBAR<<BEATRIZ<<<<<<<<





H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES														
Municipio: TUXPAN					Ejercicio: 2016					2016				
Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016					Localidad: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO									
No. de obra: 2016301890007					Fecha de elaboración: 03/10/2016									
Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DEL PUENTE ENTRE LA AVENIDA ADOLOY LOPEZ MATEOS Y LA CALLE DEL POZO DE LA COLONIA LAS DELICIAS														
Clave	Unidad	Concepto	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incrementos	P.U. decrementos	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivos	Importe finiquito
											Hoja 1 DE 2			
		PRELIMINARES												
L01-003	PZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M. DE ADHERO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, INCLUYE: 2 POSTES Y DOS APÓYOS HORIZONTALES DE 1.00 M. DE ZINTRO GALV. DE 1" DE 1.20 M., SEGÚN CROQUIS DE DISEÑO DE LETRERO	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,889.32	\$0.00	\$0.00	\$1,889.32	\$1,889.32	\$0.00	\$0.00	\$1,889.32
TRAZ-003	M2	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	481.55	95.86	474.79	577.41	\$6.76	\$0.00	\$0.00	\$6.76	\$3,255.28	\$648.01	\$0.00	\$3,903.29
EXC-001	M3	EXCAVACIÓN A MANO EN CERRA CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	111.92	8.87	0.00	120.79	\$193.21	\$0.00	\$0.00	\$193.21	\$23,624.06	\$1,713.77	\$0.00	\$23,337.83
GUAR-003	ML	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	414.41	78.63	490.26	490.26	\$335.78	\$0.00	\$0.00	\$335.78	\$139,150.59	\$25,468.91	\$0.00	\$164,619.50
GUAR-004	ML	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X20 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESMURA, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	72.16	0.00	0.00	72.16	\$493.10	\$0.00	\$0.00	\$493.10	\$35,582.10	\$0.00	\$0.00	\$35,582.10
GUAR-005	ML	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X30X100 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, CORRECTA EJECUCIÓN.	26.11	0.00	0.00	26.11	\$666.21	\$0.00	\$0.00	\$666.21	\$17,394.74	\$0.00	\$0.00	\$17,394.74
METTER-001	M3	MEJORAMIENTO DE SUELO CON MATERIAL DEL BANCO DE CUTE COMPACTADO CON MEDIO MECÁNICOS Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCLUYE: ACARreo DENTRO DE LA OBRA, MEDIO COMPACTO.	24.11	0.00	0.00	24.11	\$372.31	\$0.00	\$0.00	\$372.31	\$8,976.39	\$0.00	\$0.00	\$8,976.39
RELL-020	M3	RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA PARA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	103.63	10.20	0.00	114.03	\$263.53	\$0.00	\$0.00	\$263.53	\$27,362.32	\$2,688.01	\$0.00	\$30,050.33
BANQ-003	M2	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA, CHIRRIADO Y DESMURADO, JUNTA DE CELOTEX Y GUARANTEO @ 20 MTS., JUNTAS PRUAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.0	431.23	84.38	144.51	515.61	\$286.72	\$0.00	\$0.00	\$286.72	\$123,642.27	\$24,183.43	\$0.00	\$147,825.70
CYA-005	M3	CARGA Y ACARREO A PRIMER KIÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN VOLTEC. INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL	145.50	12.88	115.08	158.38	\$30.42	\$0.00	\$0.00	\$30.42	\$4,426.11	\$391.81	\$0.00	\$4,817.92
Subtotales hoja 1											\$383,303.18	\$55,102.94	\$0.00	\$438,407.12



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio:

TUXPAN

DATOS GENERALES

Ejercicio:

2016

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); EJERCICIO 2016

No. de obra:

2016301890007

Localidad:

TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO

Descripción de la obra:

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DEL PUENTE ENTRE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLE DEL POZO DE LA COLONIA LAS DELICIAS

Fecha de elaboración:

03/10/2016

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. increment.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	581.93	38.64	574.37	620.62	\$7.61	\$0.00	\$0.00	\$7.61	\$4,438.87	\$294.05	\$0.00	\$4,732.92
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	337.49	75.85	307.35	413.34	\$30.14	\$0.00	\$0.00	\$30.14	\$10,171.95	\$2,286.12	\$0.00	\$12,458.07
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	481.55	95.86	475.13	577.41	\$6.42	\$0.00	\$0.00	\$6.42	\$3,091.55	\$615.42	\$0.00	\$3,706.97
Subtotales hoja 2											\$17,692.37	\$3,195.59	\$0.00	\$20,887.96
Sumas totales											\$400,995.55	\$58,299.53	\$0.00	\$459,295.08
											IVA		\$73,487.21	\$532,782.29
											Total			

EJECUTO

AUTORIZO PARA PAGO

CONCENTRADO			
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
1	\$ 347,772.31	\$ 403,413.88	
2	\$ 115,581.77	\$ 134,074.85	
3			
TOTAL	\$ 463,354.08	\$ 537,490.73	

CONTRATO			
CONVENIO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
	\$400,995.55	\$463,151.84	
	\$2,358.53	\$2,335.89	
TOTAL	\$463,354.08	\$537,490.73	

IMPORTE FINIQUITO			
SALDO			
	\$0.00	\$537,490.73	\$0.00

ARQ. CESAR M. JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ENTERADO PARA PAGO

C.P. CARLOS A. FLORES CORONA
TESORERO MUNICIPAL

VERIFICO

ARQ. VICTOR MANUEL BARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

Vo. Bo.

LIC. RAUL A. RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
