



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890023



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
EJERCICIO FISCAL 2016

REUNIDOS EN LA COLONIA AMPLIACION ANTORCHISTA DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN DE RODRIGUEZ
CANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE octubre DE 2016,
REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES
CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ Y
C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO UNICO,
REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA;
RESPECTIVAMENTE.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. ROCELI RODRIGUEZ CASTELLANOS, C. JAZMIN GUADALUPE MENDEZ SANTIAGO, Y C. JAVIER ARTURO
COBOS HERNANDEZ.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN
DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	JOSE MARIA QUINTANA LOTE 27, 5 DE MAYO 93250; POZA RICA, VERACRUZ
R. F. C	[REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	ING. ILEL TINOCO CASTREJON, REPRESENTANTE LEGAL

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION FRATERNIDAD ANTORCHISTA, DE LA
LOCALIDAD DE TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890023



DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2016301890023	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$1,612,353.54	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL. DD/MM/AA 10 DE agosto DE 2016		FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL. DD/MM/AA 8 DE octubre DE 2016
REPROGRAMACION DE CONVENIOS DE DIFERIMIENTO Y AMPLIACION AL PLAZO	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA NO APLICA		FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA NO APLICA
NO. DE CONTRATO. DOP_2016301890023_FISMDF_IR_025_C030	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.		
ANTICIPO.	\$483,706.06		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. 1725499	FECHA. 8 DE agosto DE 2016	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 1725500	FECHA. 8 DE agosto DE 2016	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$1,612,353.54	\$1,612,353.54	\$ 0.00	\$1,612,353.54	\$1,612,353.54	\$ 0.00

SALDO: \$ 0.00



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890023



RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO	8 DE agosto DE 2016	\$ 0.00	\$483,706.06
1 (UNO) PARCIAL	4 DE octubre DE 2016	\$1,473,627.32	\$1,025,187.28
2 (DOS) PARCIAL		\$0.00	\$0.00
3 (TRES) PARCIAL		\$0.00	\$0.00
4 (CUATRO) PARCIAL		\$0.00	\$0.00
(FINQUITO)	10 DE octubre DE 2016	\$138,726.22	\$96,510.40
	TOTAL	\$1,612,353.54	\$1,605,403.74

EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. VICTOR MANUEL PARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

ING. ILEL TINOCO CASTREJON
REPRESENTANTE LEGAL

ING. CESAR AUGUSTO GUZMAN ESPINOSA
RESIDENTE DE OBRA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890023



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

ENTREGA

ING. ILEL TINOCO CASTREJON
REPRESENTANTE LEGAL.

ING. CESAR AUGUSTO GUZMAN ESPINOSA
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890023



47

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL

PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO

C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO.

C. ROCELI RODRIGUEZ CASTELLANOS
PRESIDENTE

C. JAZMIN GUADALUPE MENDEZ SANTIAGO
SECRETARIO

C. JAVIER ARTURO COBOS HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890023



FOTOGRAFIAS AL INICIO DE LA OBRA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890023



EN PROCESO DE LOS TRABAJOS

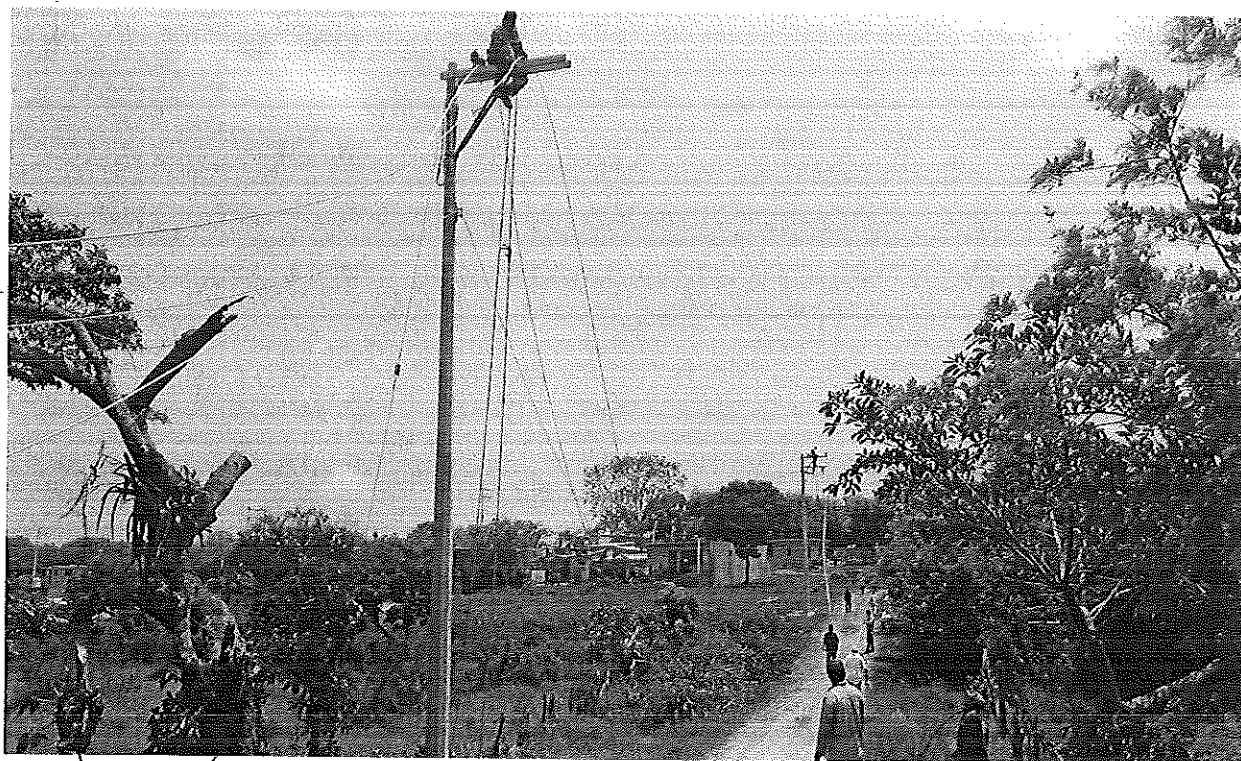




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890023



AL TÉRMINO DE LA OBRA

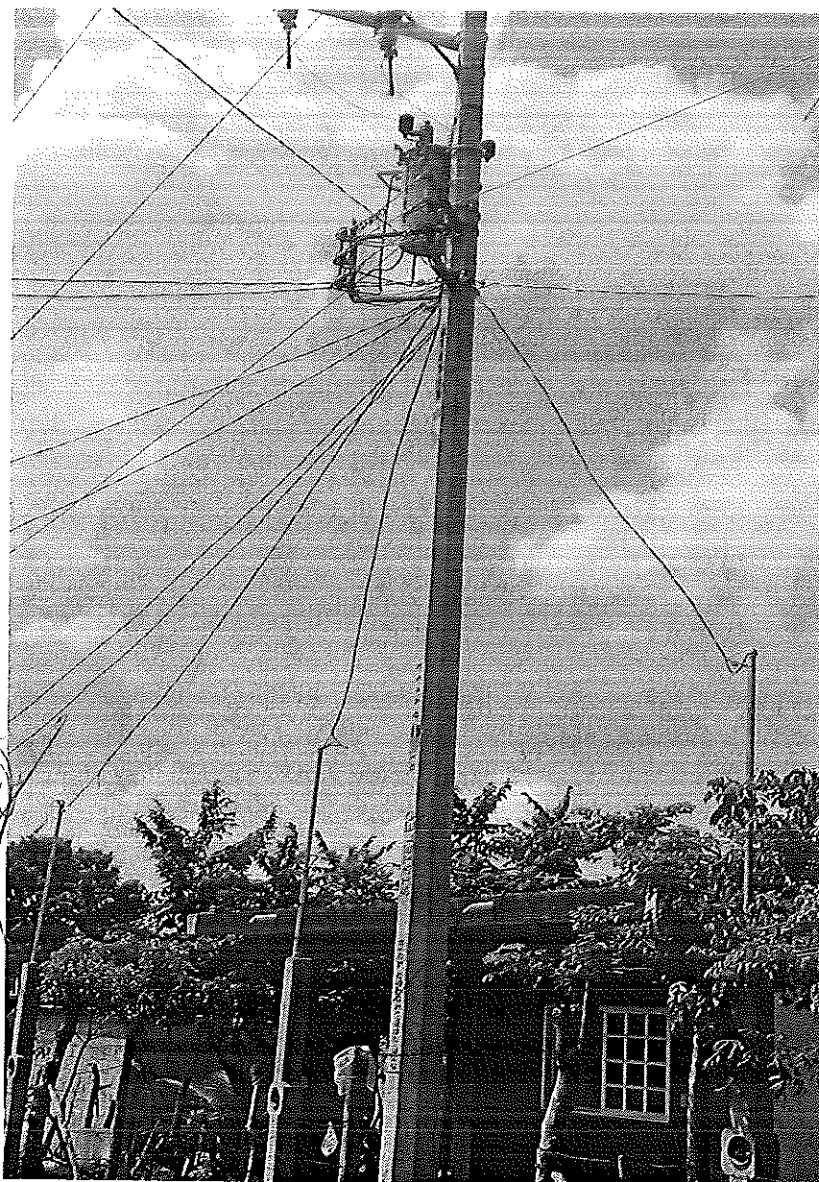

[Firmas manuscritas]

[Firmas manuscritas]



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

IDENTIFICACION



EDAD 28
SEXO M

C JUAN SOTO LARA 104
COL ALVAREZ 92820
TUXPAN, VER.



02



ESTADO 30 MUNICIPIO 188
LOCALIDAD 0001 SECCION 4114
EYES 2008 VALIDEZ HASTA 2018




55408590125

ESTE DOCUMENTO ES TRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA
DORSO O ENDOSO DORSO
C. VIGILAR ESTA CREDENCIAL A NOTIFICAR EL DORSO ES COLOCADO EN
LOS SI GAN SIGUIENTES A QUE ESTE
DORSO

[Signature]

PODERADO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

SECRETARIA DE INTERIORES

SECRETARIA DE INTERIORES

SECRETARIA DE INTERIORES

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

EDAD 18
 SEXO H

DOMICILIO
 C VICENTE SUAREZ 16
 COL AZTECA 92820
 TUXPAN, VER.

2008 00

ESTADO VER. REGISTRO 300
 LOCALIDAD 0001 SECCION 4103
 RESIDA 2009 VIGENCIA HASTA 2019



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO SE VALDRA SI PRESENTA TACHA
 O FALTA O EMENDACIONES

EL VOTANTE ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 CAMBIO

EDMUNDO ALONSO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

LOCALIDAD 0001 SECCION 4103





H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES													
Municipio: TUXPAN				Ejercicio: 2016									
Fondo de APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2016				Localidad: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO									
No. de obra: 2016301890023				Fecha de elaboración: 10 de octubre de 2016									
Descripción de la obra: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN FRATERNIDAD ANTORCHISTA													
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales		
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe finiquito
											Hoja 1	DE	3
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$371.38	\$0.00	\$0.00	\$371.38	\$0.00	\$0.00	\$371.38
PCI2-750	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INCLUYE: HINCADO, PLOMEADO, CEPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	20.00	0.00	0.00	20.00	\$8,371.56	\$0.00	\$0.00	\$8,371.56	\$167,431.20	\$0.00	\$167,431.20
BUS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BUS DE RECEPCIÓN DE ACOMETIDAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$2,936.53	\$0.00	\$0.00	\$2,936.53	\$35,238.36	\$0.00	\$35,238.36
EST-RVE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RVE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	12.00	0.00	1.00	11.00	\$5,740.63	\$0.00	\$0.00	\$5,740.63	\$68,887.56	\$0.00	\$68,146.93
EST-1K	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1K, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,261.24	\$0.00	\$0.00	\$1,261.24	\$0.00	\$0.00	\$1,261.24
EST-3K	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 3K, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$2,486.07	\$0.00	\$0.00	\$2,486.07	\$29,832.84	\$0.00	\$29,832.84
CF-2CCFZA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2CCFZA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,996.01	\$0.00	\$0.00	\$5,996.01	\$5,996.01	\$0.00	\$5,996.01
EST-RDZN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RDZN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,018.23	\$0.00	\$0.00	\$5,018.23	\$5,018.23	\$0.00	\$5,018.23
EST-VRZN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VRZN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$5,664.73	\$0.00	\$0.00	\$5,664.73	\$28,323.65	\$0.00	\$28,323.65
EST-VSZN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VSZN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	11.00	0.00	2.00	9.00	\$4,089.68	\$0.00	\$0.00	\$4,089.68	\$44,986.48	\$0.00	\$36,807.12
EST-VR2N/VR2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VR2N/VR2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$12,060.02	\$0.00	\$0.00	\$12,060.02	\$24,120.04	\$0.00	\$24,120.04
EST-VS30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS30, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$6,285.74	\$0.00	\$0.00	\$6,285.74	\$6,285.74	\$0.00	\$6,285.74
Subtotales hoja 1											\$417,752.73	\$0.00	\$403,832.74



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio:

TUXPAN

DATOS GENERALES

Ejercicio:

2016

Fuente de financiamiento:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2016

No. de obra:

2016301890023

Descripción de la obra:

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN FRATERNIDAD ANTORCHISTA

Localidad:

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

Fecha de elaboración:

10 de octubre de 2016

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivos	Importe finiquito
											Hoja 2		DE	3
EST-RDZ/ RDZ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDZ/RDZ, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$10,217.58	\$0.00	\$0.00	\$10,217.58	\$10,217.58	\$0.00	\$0.00	\$10,217.58
EST-VAZIN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VAZIN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$9,332.98	\$0.00	\$0.00	\$9,332.98	\$19,665.96	\$0.00	\$0.00	\$18,665.96
EST-ITRZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA ITRZA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$8,653.07	\$0.00	\$0.00	\$8,653.07	\$103,836.84	\$0.00	\$0.00	\$103,836.84
TRAUT-10KVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO ACERO INOXIDABLE DE 10 KVA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	\$27,954.75	\$0.00	\$0.00	\$27,954.75	\$195,683.25	\$0.00	\$0.00	\$195,683.25
TRBFA-UT-15KVA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR BIFASICO TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO ACERO INOXIDABLE DE 15 KVA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$30,064.38	\$0.00	\$0.00	\$30,064.38	\$150,321.90	\$0.00	\$0.00	\$150,321.90
CONDA AC 3/0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 3/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	KG	468.21	0.00	12.7423	455.4677	\$122.03	\$0.00	\$0.00	\$122.03	\$57,135.67	\$0.00	\$1,554.95	\$55,580.72
CONDA AC 1/0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AAC 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	KG	139.34	0.00	2.71	136.63	\$122.03	\$0.00	\$0.00	\$122.03	\$17,003.66	\$0.00	\$330.70	\$16,672.96
ACOMAE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS AERIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	107.00	0.00	8.00	99.00	\$1,267.20	\$0.00	\$0.00	\$1,267.20	\$135,590.40	\$0.00	\$10,137.60	\$125,452.80
ACORHU AE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS PARA ACOMETIDAS AERIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	107.00	0.00	8.00	99.00	\$2,042.02	\$0.00	\$0.00	\$2,042.02	\$218,496.14	\$0.00	\$16,336.16	\$202,159.98
ILU-OVIS	FOTOCORDA TUBO DE 1.20 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	12.00	0.00	0.00	12.00	\$2,822.30	\$0.00	\$0.00	\$2,822.30	\$33,867.60	\$0.00	\$0.00	\$33,867.60
EST-RDA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RDA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	\$2,062.34	\$0.00	\$0.00	\$2,062.34	\$2,062.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APARTA ALEA 13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALEA 13 KY DE LÍNEA PRIMARIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	\$2,283.82	\$0.00	\$0.00	\$2,283.82	\$4,567.64	\$0.00	\$4,567.64	\$0.00
Subtotales hoja 2											\$947,448.38	\$0.00	\$34,989.39	\$912,459.59



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

Municipio:

TUXPAN

DATOS GENERALES

Ejercicio:

2016

Fuente de Financiamiento:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2016

No. de obra:

2016301890023

Localidad:

TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO

Descripción de la obra:

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN FRATERNIDAD ANTORCHISTA

Fecha de elaboración:

10 de octubre de 2016

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Increment.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivas
											Hoja 3		DE 3
PODA-001	PODA DE RAMAS Y ÁRBOLES QUE INTERFERIRAN EN EL TRAZO, TENIDOR DE LA LÍNEA ELÉCTRICA. INCLUYE MANIOBRAS, CARGA Y ACORREO DE DESPERDICIO FUERA DEL SITIO DE LA OBRA	M	412.80	0.00	58.99	353.81	\$34.39	\$0.00	\$0.00	\$34.39	\$14,196.19	\$0.00	\$2,028.66
PCL2-750-LV	PARADO DE POSTE PCL2-750 BAJO LÍNEA VIVA DE CTE. INCLUYE MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$10,562.05	\$0.00	\$0.00	\$10,562.05	\$10,562.05	\$0.00	\$0.00
EXT01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VOTON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	\$8,648.46	\$0.00	\$0.00	\$8,648.46	\$0.00	\$17,296.92	\$0.00
EXT02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RSA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$1,309.50	\$0.00	\$0.00	\$1,309.50	\$0.00	\$1,309.50	\$0.00
EXT03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA REA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$5,109.02	\$0.00	\$0.00	\$5,109.02	\$0.00	\$5,109.02	\$0.00
EXT04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 X 30. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD DE LA C.F.E.	PZA	0.00	30.00	0.00	30.00	\$907.42	\$0.00	\$0.00	\$907.42	\$0.00	\$27,222.60	\$0.00
Subtotales hoja 3											\$24,758.24	\$50,938.04	\$2,028.66
Sumas totales											\$1,389,959.95	\$50,938.04	\$50,938.04
											IIVA		
											Total		
											\$1,612,353.54		

EJECUTÓ
ING. IEL TINOCO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
MATERIALES OCONIT S.A. DE C.V.

AUTORIZÓ PARA PAGO
ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

V.O. Bo.
LIC. RAUL A. RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VERIFICÓ
ARQ. VICTOR MANUEL PARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

ENTERADO PARA PAGO
C.P. CARLOS A. FLORES CORONA
TESORERO MUNICIPAL

CONCENTRADO			
ESTIMACION	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	
01 (UNO) PARCIAL	\$ 1,270,368.38	\$ 1,473,627.22	
02 (DOS) FIN	\$ 119,591.57	\$ 138,726.22	
TOTAL	\$ 1,389,959.95	\$ 1,612,353.54	
CONVENIO			
IMPORTE S/IVA	\$ 1,389,959.95	\$ 1,612,353.54	
CONVENIO	\$0.00	\$ -	
TOTAL	\$1,389,959.95	\$ 1,612,353.54	
IMPORTE FINIQUITO			
IMPORTE S/IVA	\$1,389,959.95	\$1,612,353.54	
SALDO	\$0.00	\$0.00	
