



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890039



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
EJERCICIO FISCAL 2016

REUNIDOS EN LA LOCALIDAD PRAXEDIS GUERRERO KM-18 DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 7 DE noviembre DE 2016, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. JUAN PABLO GOMEZ MENDEZ, C. ROBERTA LOPEZ LEONIDES, Y C. DAMARIS LUCERO TECOYA RIVERA.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	GRUPO CONSTRUCTOR GSC, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	URSULO GALVAN No. 37, ADOLFO RUIZ CORTINES 92880; TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO, VERACRUZ
R. F. C	[REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	ING. OMAR CRUZ CRUZ, APODERADO LEGAL

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO KM-18, DE LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO (KILOMETRO 18) DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890039



DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2016301890039	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$859,081.06	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL. DD/MM/AA 26 DE agosto DE 2016		FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL. DD/MM/AA 9 DE octubre DE 2016
	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA 7 DE septiembre DE 2016		FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA 1 DE noviembre DE 2016
REPROGRAMACION DE CONVENIOS DE DIFERIMIENTO Y AMPLIACION AL PLAZO			
NO. DE CONTRATO. DOP_2016301890039_FIS MDF__IR_029_C034	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA		
ANTICIPO.	\$257,724.32		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. 4249-00585-9	FECHA. 24 DE agosto DE 2016	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 4249-00586-2	FECHA. 24 DE agosto DE 2016	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO.	FECHA.	

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$859,081.06	\$859,081.06	\$ 0.00	\$859,081.06	\$859,081.06	\$0.00

SALDO: \$ 0.00



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890039



RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO	24 DE agosto DE 2016	\$ 0.00	\$257,724.32
1 (UNO) PARCIAL	1 DE octubre DE 2016	\$441,611.81	\$307,224.77
2 (DOS) PARCIAL	18 DE octubre DE 2016	\$270,496.89	\$188,181.89
3 (TRES) PARCIAL		\$0.00	\$0.00
4 (CUATRO) PARCIAL		\$0.00	\$0.00
(FINIQUITO)		\$146,972.36	\$102,247.15
	TOTAL	\$859,081.06	\$855,378.13

EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ANSELMO MEZA HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. OMAR CRUZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. FRANCISCO ESCALANTE MENDEZ
RESIDENTE DE OBRA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890039



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

ENTREGA

ING. OMAR CRUZ CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL.

ING. FRANCISCO ESCALANTE MENDEZ
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


Roberta López



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION


NO. DE OBRA: 2016301890039





C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL


LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL



PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ
REGIDOR PRIMERO



C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO.


C. JUAN PABLO GOMEZ MENDEZ
PRESIDENTE


C. ROBERTA LOPEZ LEONIDES
SECRETARIO


C. DAMARIS LUCERO TECOYA RIVERA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890039



FOTOGRAFIAS AL INICIO DE LA OBRA

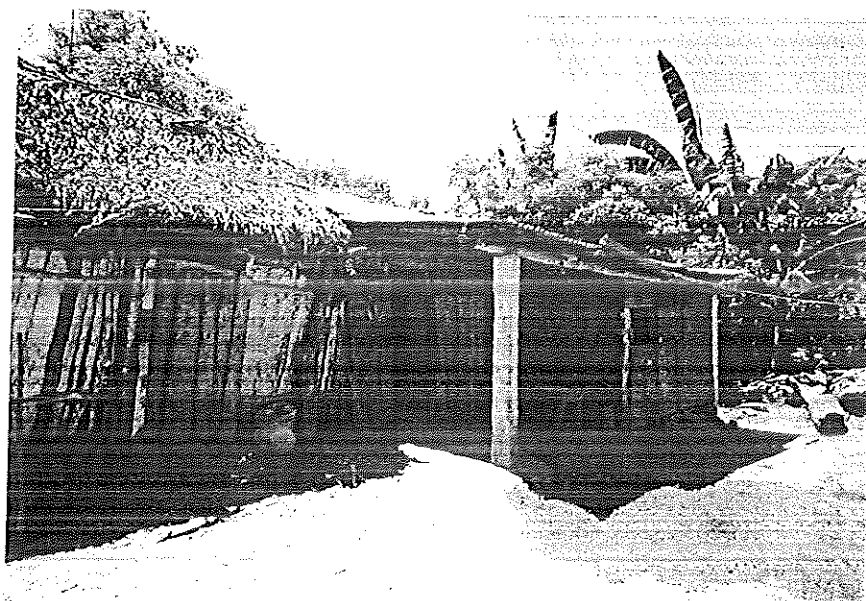

Roberta López




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890039



EN PROCESO DE LOS TRABAJOS

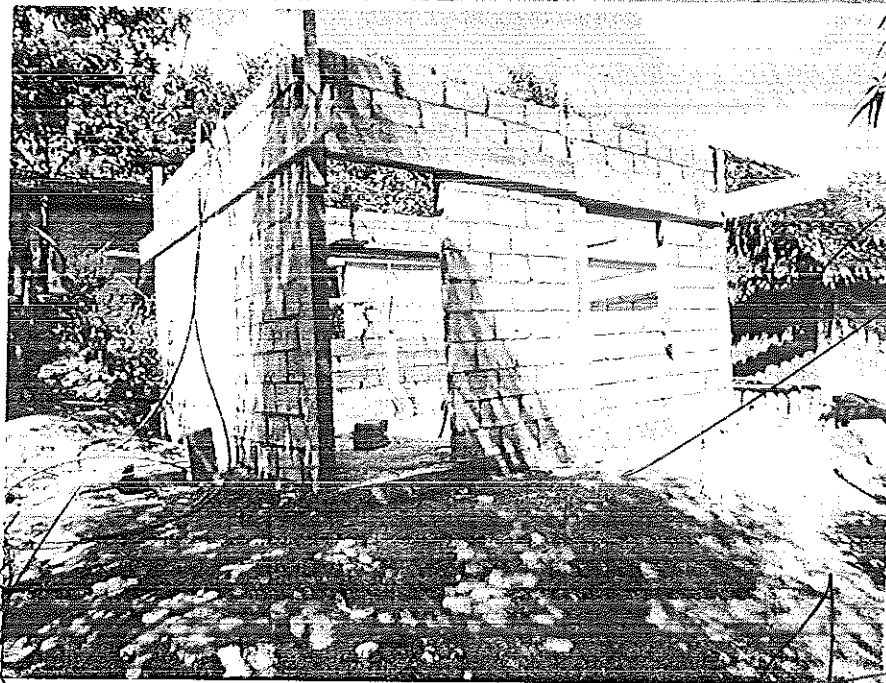

Roberto López




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890039



AL TÉRMINO DE LA OBRA

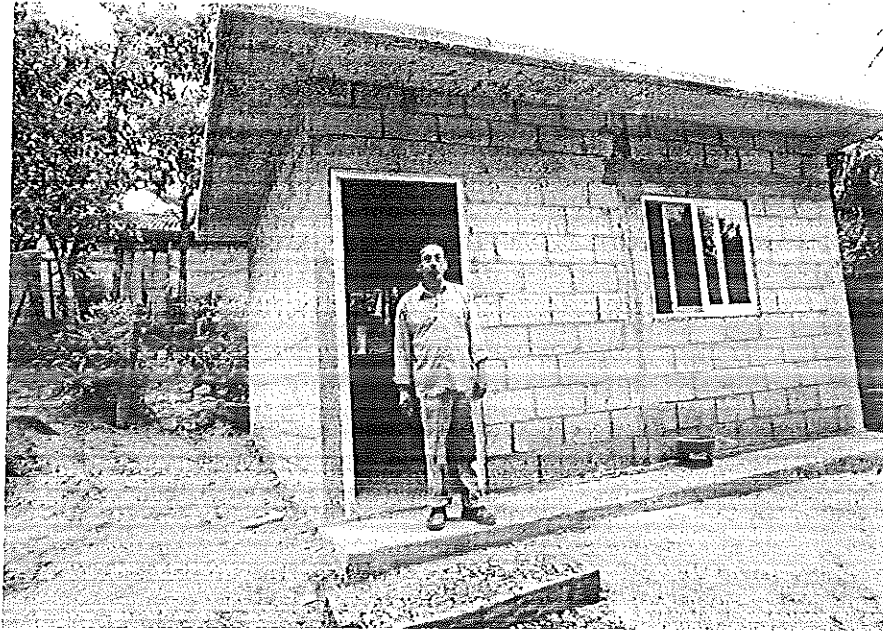

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Roberto López

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

4

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES														
Municipio: TUXPAN				Ejercicio: 2016										
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), EJERCICIO 2016				Localidad: MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.										
No. de obra: 2016301890039				Fecha de elaboración: 02/11/2016										
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO KM - 18														
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Incremento.	P.U. decremento.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
	PRELIMINARES										Hoja 1 DE 4			
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00 X 1.50 MTS. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6 MM. DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$392.87	\$0.00	\$0.00	\$392.87	\$392.87	\$0.00	\$0.00	\$392.87
LIM-005	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DEL TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA, DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT DE DISTANCIA	M2	322.40	0.00	0.00	322.40	\$5.76	\$0.00	\$0.00	\$5.76	\$1,857.02	\$0.00	\$0.00	\$1,857.02
TRAZ-004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS	M2	322.40	0.00	0.00	322.40	\$6.01	\$0.00	\$0.00	\$6.01	\$1,937.62	\$0.00	\$0.00	\$1,937.62
DESPL-001	DESPLANTE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA	M3	32.20	0.00	0.00	32.20	\$239.30	\$0.00	\$0.00	\$239.30	\$7,705.46	\$0.00	\$0.00	\$7,705.46
EXC-001	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	12.30	0.00	0.00	12.30	\$204.52	\$0.00	\$0.00	\$204.52	\$2,515.60	\$0.00	\$0.00	\$2,515.60
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	3.60	0.00	0.00	3.60	\$141.65	\$0.00	\$0.00	\$141.65	\$509.94	\$0.00	\$0.00	\$509.94
RELL-020	RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	32.20	0.00	0.00	32.20	\$258.10	\$0.00	\$0.00	\$258.10	\$8,310.82	\$0.00	\$0.00	\$8,310.82
CYA-008	CARGA Y ACARREO DE HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	53.20	0.00	0.00	53.20	\$108.05	\$0.00	\$0.00	\$108.05	\$5,748.26	\$0.00	\$0.00	\$5,748.26
RELL-002	TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	53.20	0.00	0.00	53.20	\$68.19	\$0.00	\$0.00	\$68.19	\$3,627.71	\$0.00	\$0.00	\$3,627.71
Subtotales hoja 1											\$32,605.30	\$0.00	\$0.00	\$32,605.30

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

Municipio: TUXPAN		Ejercicio: 2016
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF), EJERCICIO 2016		Localidad: MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.
No. de obra: 2016301890039	Fecha de elaboración: 02/11/2016	
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO KM - 18		

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

[Handwritten signatures and stamps are present in this area, including a large circular stamp on the right side.]

H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES														
Municipio: TUXPAN				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO 2016				Ejercicio: 2016				MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.		
Fuente de Financiamiento: DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), EJERCICIO 2016				2016301890039				Fecha de elaboración: 02/11/2016						
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO KM - 18														
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. Increment.	P.U. Decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivos	Importe finiquito
ALBANTILERIA														
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO INFER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M2	322.40	0.00	0.00	322.40	\$105.05	\$0.00	\$0.00	\$105.05	\$33,668.12	\$0.00	\$0.00	\$33,668.12
BANO-004	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA P.C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR, ANCHO PROMEDIO 0.60 MTS. ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELLON DE 10 x 12 CMS. CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO	M	41.20	0.00	0.00	41.20	\$275.19	\$0.00	\$0.00	\$275.19	\$11,337.83	\$0.00	\$0.00	\$11,337.83
EMB-001	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: PERFILADO DE DOS ARISTAS.	M	139.60	0.00	0.00	139.60	\$69.79	\$0.00	\$0.00	\$69.79	\$9,742.68	\$0.00	\$0.00	\$9,742.68
CANCELERIA														
VENTAL-001	VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM. HOJA CORREDIZA Y FDO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.00	0.00	0.00	20.00	\$2,518.95	\$0.00	\$0.00	\$2,518.95	\$50,379.00	\$0.00	\$0.00	\$50,379.00
PUERT-001	PUERTA DE HERRERIA DE 2.13 X 0.90 M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLES EN PLANO	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$2,184.74	\$0.00	\$0.00	\$2,184.74	\$21,847.40	\$0.00	\$0.00	\$21,847.40
INSTALACION ELECTRICA														
INSE-024CD	ALIMENTADOR ELECTRICOS CON CABLE DEL THW CAL. 10, 2 HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	M	120.00	0.00	0.00	120.00	\$41.97	\$0.00	\$0.00	\$41.97	\$5,036.40	\$0.00	\$0.00	\$5,036.40
INSE-023CO	MUFA 3/4" Ø, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 MTS. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REHATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$170.87	\$0.00	\$0.00	\$170.87	\$1,708.70	\$0.00	\$0.00	\$1,708.70
Subtotales hoja 3											\$133,920.13	\$0.00	\$0.00	\$133,920.13

[Handwritten signatures and stamps]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.256444>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

TUXPAN

2016

Localidad: MUNICIPIO DE TUXPAN, VER.

elaboración:

81-157


 EJECUTÓ
 ING. OMAR CRUZ CRUZ
 APODERADO LEGAL
 GRUPO CONSTRUCTOR GSC S.A. DE C.V.


 VERFICO
 ARQ. ARMANDO FLORES CORONA
 SUPERVISOR DE OBRA


 AUTORIZO PARA PAGAR
 ARQ. CESAR EDEUARDO JUAREZ CHIMAL
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 ENTREGADO PARA PAGAR
 C.P. CARLOS A. FLORES CORONA
 TITULO MUNICIPAL

CONTRATO: CONVENIO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
	\$ 740,587.12	\$ 859,081.06
TOTAL	\$ 740,587.12	\$ 859,081.06

IMPORTE FINIQUITO	\$ 740,587.12	\$ 859,081.06
SALDO	\$ -	\$ -
