



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890042



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
EJERCICIO FISCAL 2016

REUNIDOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPIQUILLO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 17 DE agosto DE 2016, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. GILBERTO MORALES PEREZ, C. MINERVA PEREZ SANTOS, Y C. TERESA DE JESUS ANTONIO HERNANDEZ.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	PROYECTOS EDUSTAFRAN, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	BLVD. RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE No. 168, SAN MANUEL 93600; MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ
R. F. C	[REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	ING. STALIN SANCHEZ MACIAS, REPRESENTANTE LEGAL

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TAMPIQUILLO, DE LA LOCALIDAD DE TAMPIQUILLO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890042



DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2016301890042	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$601,625.91	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL. DD/MM/AA 29 DE junio DE 2016		FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL. DD/MM/AA 12 DE agosto DE 2016
REPROGRAMACION DE CONVENIOS DE DIFERIMIENTO Y AMPLIACION AL PLAZO	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA NO APLICA		FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA NO APLICA
NO. DE CONTRATO. DOP_2016301890042_FISMDF_IR_007_C007	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA		
ANTICIPO.	\$180,487.77		
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. 3616-09146-2	FECHA. 27 DE junio DE 2016	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 3616-0947-3	FECHA. 27 DE junio DE 2016	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$601,625.91	\$601,625.91	\$ 0.00	\$601,625.91	\$601,625.91	\$ 0.00

SALDO: \$ 0.00



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890042



RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO	27 DE junio DE 2016	\$ 0.00	\$180,487.77
1 (UNO) PARCIAL	2 DE septiembre DE 2016	\$457,195.42	\$318,066.12
2 (DOS) PARCIAL		\$ 0.00	\$0.00
3 (TRES) PARCIAL		\$ 0.00	\$0.00
4 (CUATRO) PARCIAL		\$ 0.00	\$0.00
(FINIQUITO)	15 DE noviembre DE 2016	\$144,430.49	\$100,478.800
	TOTAL	\$601,625.91	\$599,032.69

EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.

ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

ING. STALIN SANCHEZ MACIAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890042



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

ENTREGA

ING. STALIN SANCHEZ MACIAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890042



47.

C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL

PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO

C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO.

C. GILBERTO MORALES PEREZ
PRESIDENTE

C. MINERVA PEREZ SANTOS
SECRETARIO

C. TERESA DE JESUS ANTONIO HERNANDEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

Minerva Perez Santos.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890042



FOTOGRAFIAS AL INICIO DE LA OBRA



Veracruz, México 11 de 02

Municipio de San Andrés

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]


[Firma]

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890042



EN PROCESO DE LOS TRABAJOS

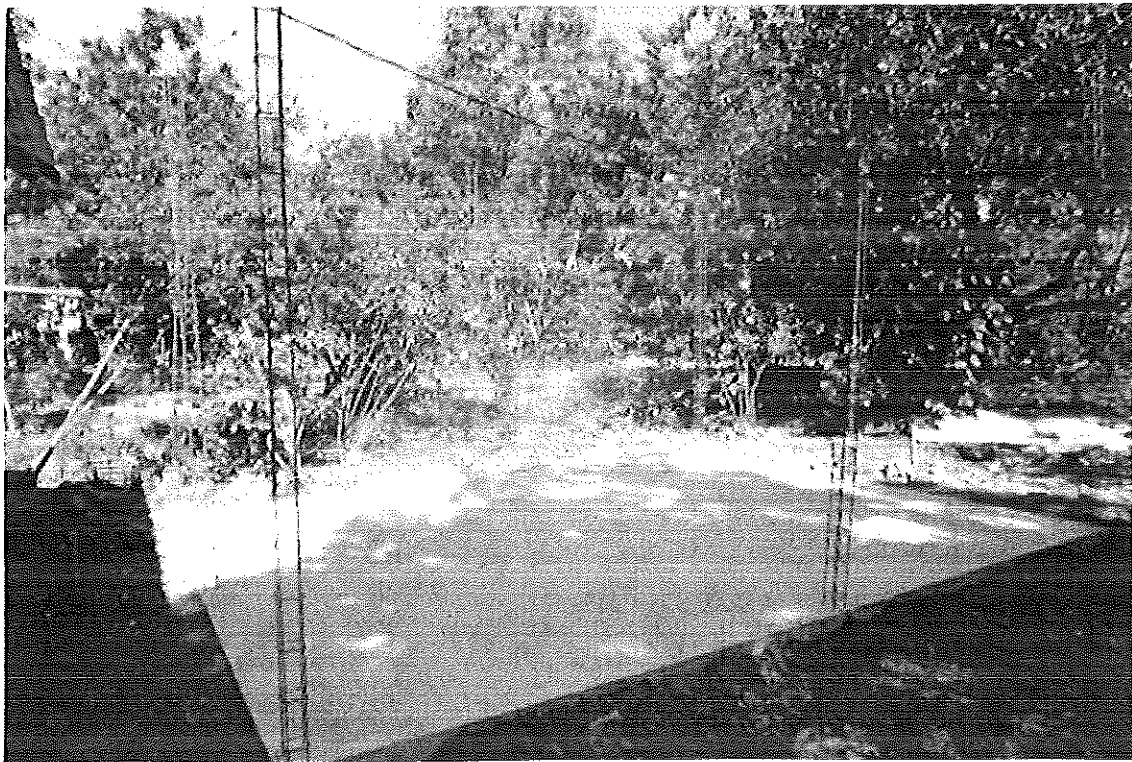



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890042



AL TÉRMINO DE LA OBRA



Concepción Martínez

Minerva Pérez Santos

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 [REDACTED]

DOMICILIO
 C PASAJE GUADALUPE 103
 COL LA FAMA 68100
 SANTA CATARINA, N.L.
 C.P. 42600767

COND. 21
SEXO H

AÑO DE REGISTRO 2002 02

ESTADO 19 **DISTRITO**
MUNICIPIO 048 **LOCALIDAD** 0001 **SECCION** 2082



ESTE DOCUMENTO ES TRANSFERIBLE
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TALLA,
 PUNTA O DETERIORO ALGUNO.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

[Signature]
FERRANDO BERTUQUE MUÑOZ
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL


2062086693730

ELECCIONES FEDERALES
 12 03 06 08

LOCALES
 08 10 14 02 03 04 05 06 07 08

ESTADÍSTICAS
 (2002)





IDMEX1120208705<<4154014955132
7004029M2412311MEX<02<<01746<0
PEREZ<SANTOS<<MINERVA<<<<<<<<

EST DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACOS,
 CUPAS O ENCOLOCADURAS
 EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A MOSTRAR EL CARNÉ DE CONCILO EN
 LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A CADA ESTE
 OCURSA

ESTANISLAO RODRÍGUEZ MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Tuxtepec, Oaxaca, 11 de febrero de 2013

ELABORACIÓN: LOCALIDAD:

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

EDAD 38
 SEXO M

C S/H HOMBRE S/H
 LOC TAMPAKULLO 92770
 TUXPAN, VER.
 CLAVE 0000012641526 AÑO DE REGISTRO 1993 02


ESTADO JU MASCOS 108
 LOCALIDAD 0110 SECCION 4154
 DISEÑO 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FPIA



DATOS GENERALES															
Municipio: TUXPAN				Ejercicio: 2016				Localidad: TAMPIQUILLO							
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2016.				Fecha de elaboración: 15/11/2016											
No. de obra: 2016301890042				Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TAMPIQUILLO											
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales						
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. increment.	P.U. decrement.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito		
	PRELIMINARES									Hoja 1 DE 4					
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M., SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00	0.00	0.00	\$428.74	\$	- \$	-	\$428.74	\$	- \$	-	\$428.74	
LM-005	LIMPIEZA Y DESENRAÍCE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA	M2	225.68	0.00	0.00	\$6.73	\$	- \$	-	\$6.73	\$1,518.83	\$	- \$	-	\$1,518.83
TRAZ-004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	225.68	0.00	0.00	\$6.39	\$	- \$	-	\$6.39	\$1,442.10	\$	- \$	-	\$1,442.10
DESP-001	DESPLANTE DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANIAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA.	M3	22.54	0.00	0.00	\$248.37	\$	- \$	-	\$248.37	\$5,598.26	\$	- \$	-	\$5,598.26
BOC-001	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	8.61	0.00	0.00	\$206.34	\$	- \$	-	\$206.34	\$1,776.59	\$	- \$	-	\$1,776.59
REL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	2.52	0.00	0.00	\$164.25	\$	- \$	-	\$164.25	\$413.91	\$	- \$	-	\$413.91
REL-020	RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE; ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	22.54	0.00	0.00	\$285.16	\$	- \$	-	\$285.16	\$6,427.51	\$	- \$	-	\$6,427.51
CVA-008	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL EN CARRETLILLA DE 0.28 M3 A 20.00 M. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN, INCLUYE; CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	37.24	0.00	0.00	\$115.63	\$	- \$	-	\$115.63	\$4,306.06	\$	- \$	-	\$4,306.06
REL-002	TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	17.24	0.00	0.00	\$74.53	\$	- \$	-	\$74.53	\$2,663.78	\$	- \$	-	\$2,663.78
Subtotales Hoja 1										\$24,575.78	\$	- \$	-	\$24,575.78	



Subtotales	Hoja 2	\$365,062.27	\$0.00	\$0.00
				



FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES															
Municipio: TUXPAN				Ejercicio: 2016				Localidad: TAMPIQUILLO							
Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2016.				Fecha de elaboración: 15/11/2016											
No. de obra: 2016301890042				Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TAMPIQUILLO											
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. PRESUP.	P.U. increment.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivos	Importe finiquito	
Hoja 3 DE 4															
CIMB-006	CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	159.60	0.00	0.00	159.60	\$28.17	\$	-	\$	\$4,495.93	\$	-	\$	\$4,495.93
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO Y AISLANTE TERMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE: 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	225.68	0.00	0.00	225.68	\$105.84	\$	-	\$	\$23,885.97	\$	-	\$	\$23,885.97
BANQ-004	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR ANCHO PROMEDIO DE 0.60 CMS., ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE: DENTELON DE 10 X 12 CMS., CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M	28.84	0.00	0.00	28.84	\$299.45	\$	-	\$	\$8,636.14	\$	-	\$	\$8,636.14
EMB-001	EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE, 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE PERFILEADO DE DOS ARISTAS.	M	97.72	0.00	0.00	97.72	\$72.33	\$	-	\$	\$7,068.09	\$	-	\$	\$7,068.09
CANCELERIA															
VENTA-001	VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM, HOJA CORREDIZA Y FIDO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	14.00	0.00	0.00	14.00	\$2,103.71	\$	-	\$	\$29,451.94	\$	-	\$	\$29,451.94
PUERT-001	PUERTA DE HERRERÍA DE 2.13 X 0.90M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE: MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLES EN PLANO.	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	\$2,430.22	\$	-	\$	\$17,011.54	\$	-	\$	\$17,011.54
INSTALACION ELECTRICA															
INSE-023CD	ALIMENTADOR ELECTRICCO CON CABLE DEL THW CAL. 10 DOS HILOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN	M	84.00	0.00	0.00	84.00	\$44.14	\$	-	\$	\$3,707.76	\$	-	\$	\$3,707.76
INSE-023CD	MUFA 3/4" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLE 0.30 mts. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	PZA	7.00	0.00	0.00	7.00	\$184.49	\$	-	\$	\$1,291.43	\$	-	\$	\$1,291.43
Subtotales Hoja 3											\$95,548.80	\$	-	\$	\$95,548.80



H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER.

FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES													
Municipio:				TUXPAN				Ejercicio:		2016			
Fuente de Financiamiento:				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2016.				Localidad:		TAMPQUIILLO			
No. de obra:				2016301890042				Fecha de elaboración:		15/11/2016			
Descripción de la obra:				CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TAMPQUIILLO									
Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivos	Vol. deduc.	P.U. PRESUP.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deductivos	Importe finiquito
										Hoja	4	DE	4
INSE-022CDA	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMP. RMS, INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	PZA	7.00	\$0.00	\$0.00	\$655.61	\$ -	\$ -	\$655.61	\$4,589.27	\$ -	\$ -	\$4,589.27
INSE-022CD	VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.50 M. DE LONGTUD, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	PZA	7.00	\$0.00	\$0.00	\$301.04	\$ -	\$ -	\$301.04	\$2,107.28	\$ -	\$ -	\$2,107.28
INSE-022CD	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE: FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL.12, CABLE DE COBRE CAL.14, CAJA REGISTRO 4"x4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	SAL	28.00	\$0.00	\$0.00	\$531.56	\$ -	\$ -	\$531.56	\$14,883.68	\$ -	\$ -	\$14,883.68
INSE-021CD	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E200110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	14.00	\$0.00	\$0.00	\$75.43	\$ -	\$ -	\$75.43	\$1,056.02	\$ -	\$ -	\$1,056.02
INSE-023CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESNUDO #12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO".	SAL	14.00	\$0.00	\$0.00	\$595.20	\$ -	\$ -	\$595.20	\$8,332.80	\$ -	\$ -	\$8,332.80
INSE-020CD	CONTACTO MONO-FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00	\$0.00	\$0.00	\$64.49	\$ -	\$ -	\$64.49	\$902.86	\$ -	\$ -	\$902.86
UN-001A	LIMPIEZA	M2	225.68			\$7.02	\$ -	\$ -	\$7.02	\$1,584.27	\$ -	\$ -	\$1,584.27
Subtotales hoja 4									\$33,456.18				
Sumas totales									\$518,643.03				
									IVA				
									Total				
									\$601,625.91				



FINIQUITO DE OBRA

Municipio:	TUXPAN	DATOS GENERALES	Ejercicio:	2016
------------	--------	-----------------	------------	------

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF); EJERCICIO 2016.

Fuente de Financiamiento:
No. de obra:

TAMPIQUILLO

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE TAMPIQUILLO

15/11/2016

Fecha de elaboración:

ESTIMACION	CONCENTRADO		
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
1	\$ 394,133.98	\$ 457,195.42	
2	\$ 124,509.04	\$ 144,430.49	
3			
TOTAL	\$ 518,643.02	\$ 601,625.91	

CONTRATO: CONVENIO	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
	\$518,643.02	\$601,625.91
TOTAL	\$518,643.02	\$601,625.91

IMPORTE FINIQUITO	\$518,643.02	\$601,625.91
SALDO	\$0.01	\$0.00

EJECUTÓ
ING. STAFFIN SANCHEZ MACIAS
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS EDUSTAFRAN S.A. DE C.V.

VERIFICÓ
ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZÓ PARA PAGO
ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ENTERADO PARA PAGO
C.P. CARLOS A. FLORES CORONA
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. RAUL A. RUIZ DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
