



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890055



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
EJERCICIO FISCAL 2016**

REUNIDOS EN LA COLONIA PAOLA SAMPERIO DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 17 DE noviembre DE 2016, REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ, LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN, C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA, LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ, LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ Y C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL, SINDICO ÚNICO, REGIDOR PRIMERO, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO:

C. SANDRA LEMUS CONTRERAS, C. JUANA CEFERINO LORENZO, Y C. FABIOLA RAMIREZ SALVADOR.

PRESIDENTE, SECRETARIO, Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA; RESPECTIVAMENTE, EN REPRESENTACION DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS A CONTINUACIÓN.

Y LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL.	COPOZA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO.	CHIHUAHUA No. 103, MEXICO 93310; POZA RICA, VERACRUZ
R. F. C	COP-110420-G65
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA.	LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS, APODERADO LEGAL

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PAOLA SAMPERIO, DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, VERACRUZ"

Fabiola Ramirez Salvador
Sandra Lemus Contreras
Juana Ceferino Lorenzo



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890055



DATOS DE LA OBRA.

NUMERO DE OBRA 2016301890055	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA.	INVITACIÓN RESTRINGIDA.	LICITACIÓN PÚBLICA.
MONTO DEL CONTRATO. \$629,219.61	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL. DD/MM/AA 16 DE septiembre DE 2016	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL. DD/MM/AA 30 DE octubre DE 2016	
REPROGRAMACION DE CONVENIOS DE DIFERIMIENTO Y AMPLIACION AL PLAZO	FECHA DE INICIO REAL. DD/MM/AA 30 DE septiembre DE 2016	FECHA DE TERMINO REAL. DD/MM/AA 13 DE noviembre DE 2016	
NO. DE CONTRATO. DOP_2016301890055_FIS MDF_IR_032_C037	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		
ANTICIPO. \$188,765.88			
POR ANTICIPO.	NO. DE FOLIO. 2025892	FECHA. 14 DE septiembre DE 2016	
POR CUMPLIMIENTO.	NO. DE FOLIO. 2025907	FECHA. 14 DE septiembre DE 2016	
VICIOS OCULTOS.	NO. DE FOLIO.	FECHA.	
AMPLIACION AL CUMPLIMIENTO	NO. DE FOLIO. NO APLICA	FECHA. NO APLICA	

INVERSIÓN.

INVERSIÓN APROBADA.			INVERSIÓN EJERCIDA.		
TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES	TOTAL	F.I.S.M.	PARTICIPANTES
\$629,219.61	\$629,219.61	\$ 0.00	\$629,219.61	\$629,219.61	\$ 0.00

SALDO: \$ 0.00

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

PRESIDENTE



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890055



RELACION DE LAS ESTIMACIONES.


ESTIMACIÓN	FECHA	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE LIQUIDO
ANTICIPO	14 DE septiembre DE 2016	\$ 0.00	\$188,765.88
1 (UNO) PARCIAL	28 DE octubre DE 2016	\$237,424.07	\$165,173.47
2 (DOS) PARCIAL		\$ 0.00	\$ 0.00
3 (TRES) PARCIAL		\$ 0.00	\$ 0.00
4 (CUATRO) PARCIAL		\$ 0.00	\$ 0.00
(FINIQUITO)	14 DE noviembre DE 2016	\$391,795.54	\$272,568.11
	TOTAL	\$629,219.61	\$626,507.46

EL H. AYUNTAMIENTO, HA DESIGNADO A LOS TÉCNICOS ENCARGADOS DE RECIBIR LA OBRA.


 ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Y REPRESENTANTES DE LA EMPRESA CONTRATISTA.


 LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS
 REPRESENTANTE LEGAL Y/O
 RESIDENTE DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIERREZ
 SECRETARÍA DE OBRAS
 PRACIDENTE



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890055



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL COMITÉ COMUNITARIO QUIENES SE COMPROMETEN A IMPLEMENTAR MANCOMUNADAMENTE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MISMA.

EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTES, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PARTICULARMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA. DAMOS FE...

ENTREGA

LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JULIO CESAR VELAZQUEZ CAPITAN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Asociación Romo Velazquez S/ de la obra
SECRETARIO
PRESIDENTE



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890055



C.P. CARLOS AUGUSTO FLORES CORONA.
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JAVIER BENITEZ PONCE.
SINDICO UNICO MUNICIPAL

PROF. ALFONSO SANCHEZ HERNANDEZ.
REGIDOR PRIMERO

C.P. ROBERTO GUERRERO COBOS.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

LIC. ANA ALICIA PEREZ DIAZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

POR EL COMITÉ COMUNITARIO.

C. SANDRA LEMUS CONTRERAS
PRESIDENTE
C. JUANA CEFERINO LORENZO
SECRETARIO
C. FABIOLA RAMIREZ SALVADOR
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

SECRETARÍA
PRESIDENTE



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890055



FOTOGRAFIAS AL INICIO DE LA OBRA

*Fabiola Ramirez Sanchez
Veracruz*

*Zona
SECRETARIA*



*Sandra Ilescas Contreras
ACCIDENTE*

[Handwritten signatures and scribbles]




ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890055



EN PROCESO DE LOS TRABAJOS

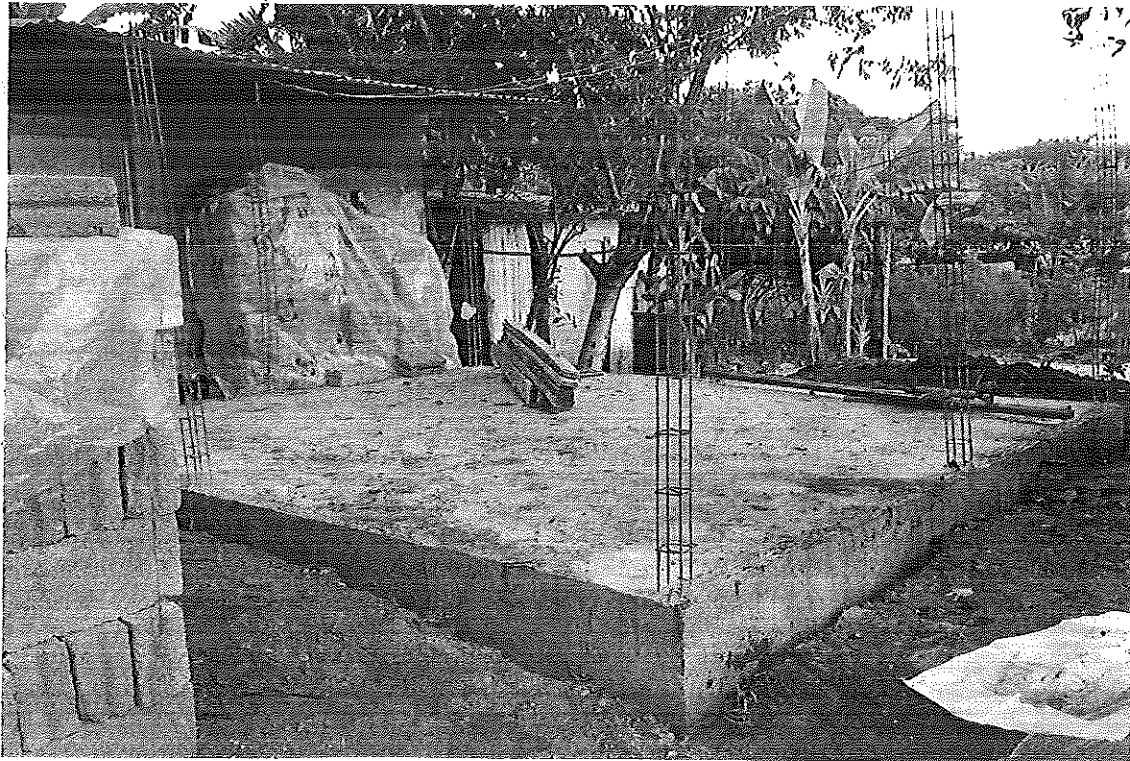

Elaborado por: *[Handwritten signature]*
SECRETARÍA

[Handwritten signature]
SECRETARÍA

[Handwritten signature]
PRESIDENTE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

NO. DE OBRA: 2016301890055




AL TÉRMINO DE LA OBRA

Labrada, Karen Elizabeth Salvador
Vocal

Jiménez
SECRETARIO

Andrés... Contreras
PRESIDENTE

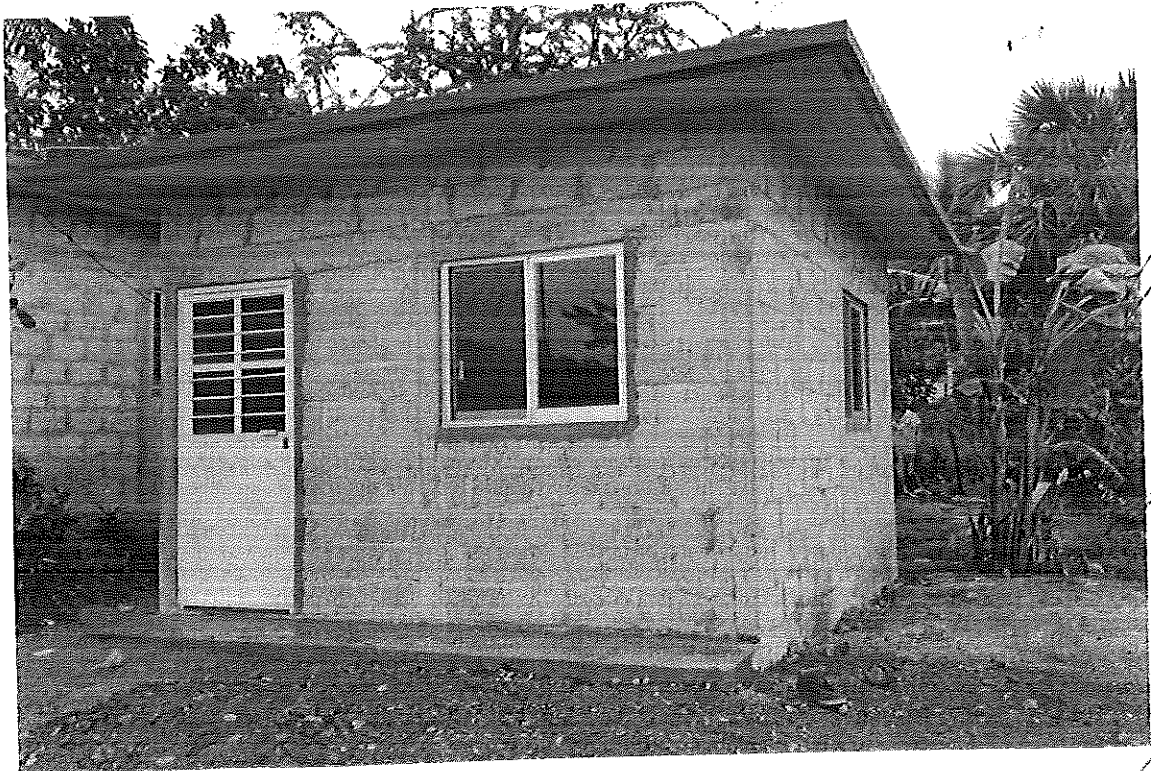

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CHEDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LEMUS
CONTRERAS
SANDRA
 DOMICILIO
CINOSCIENCIA CARBALLO S/N
COL RETONÓ 0
TUXPAN, VER.
 FECHA 03/30/03 2101895 AÑO DE REGISTRO 2008 00
 CLAVE DE ELECTOR UNICNSN8E0308301M500
 ESTADO 30 MUNICIPIO 188 LOCALIDAD 0001 SECCION 4155

EDAD 19
 SEXO M



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TAMPONAJES O EMENDACIONES.
 EL USUARIO ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

[Signature]
 MARCELO GÓMEZ REYNU
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Fingerprint]

Sandra Lemus Contreras

DE H E T T S T H

12	13	14	03
02	10	11	12
13	14	15	16
07	03		




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

USRE
 UAIREZ
 ALVADOR
 IBIOLA
 MCOLO
 ID JAZMIN S71
 X SAMPERIO 92893
 X PAN, VER.

EDAD 25
 SEXO M



JO 0430030106015 AÑO DE REGISTRO 2004 01
 VE DE ELECTOR RMSLFB8504043001800
 V RASF850404MVZMLB07
 CO 30 MUNICIPIO 188
 CLO 0001 SECCION 4155
 ME 2010 VOTO HASTA 2020



FIRMA


4350920477

ESTE DOCUMENTO ES ATENSIÓN ESPECIAL
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS
 O DERRIBOS
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
 EL CASO DE DOLICHO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 COPIA

ESTADO DE QUEROQUENA
 REGISTRO ELECTORAL DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Handwritten Signature]

Queroquena, Querétaro, Querétaro



COPOZA, S.A DE C.V.
CALLE CHIHUAHUA No. 103, COL. MEXICO POZA RICA. VERACRUZ.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP 2016301890055 FISMDF IR_032_C037
DE FECHA:	14 de septiembre de 2016

CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VER. Y POR **COPOZA, S.A DE C.V.**
 REPRESENTADO POR EL **LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS** EN SU CARÁCTER DE **APODERADO LEGAL**

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN, VER., SIENDO LAS **11:00** HRS. DEL DÍA **15 de noviembre de 2016**
 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE TUXPAN, VER., UBICADAS EN CALLE H. COLEGIO MILITAR ESQ.
 CALLE 5 DE MAYO, COL. ZAPOTE GORDO.


LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA
ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PAOLA SAMPERIO.
-------------------------	--

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	16 de septiembre de 2016
FECHA DE INICIO REAL:	30 de septiembre de 2016
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	30 de octubre de 2016
FECHA DE TERMINACION REAL:	13 de noviembre de 2016
PLAZO EN DÍAS:	45
MONTO DEL CONTRATO:	\$629,219.61
MONTO DEL CONVENIO:	0
MONTO EJERCIDO:	\$629,219.61

LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:


CLAVE	Descripción	UNIDAD	VOLUMEN
	PRELIMINARES		
IDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M., SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Pza	1.00
LIM-005	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE DENSIDAD MEDIA DE HASTA 1.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE; RETIRO DE MATERIAL HASTA 20 MT. DE DISTANCIA	M2	257.92
TRAZ-004	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	257.92
DESPL-001	DESALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA SANEAMIENTO DE AREA ALCANZANDO HASTA 10 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AMONTONAMIENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA.	M3	25.76
EXC-001	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA CON AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO II, HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M3	9.86
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	M3	2.88



COPOZA, S.A DE C.V.
 CALLE CHIHUAHUA No. 103, COL. MEXICO POZA RICA. VERACRUZ.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

RELL-020	RELLENO CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR. INCLUYE; ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3		25.76
CYA-008	CARGA Y ACARREO HORIZONTAL EN CARRETILLA DE 0.28 M3 A 20.00 M. DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN, INCLUYE; CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3		42.58
RELL-002	TENDIDO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE Y/O EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN SUPERFICIE IRREGULAR SIN COMPACTACIÓN, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3		42.58
CIMENTACIÓN				
DENT-003	DENTELLON PERIMETRAL DE 15X40 CMS.DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON 7 Ø #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. CONSIDERANDO 15 CMS. AHOGADOS EN LOSA, APISONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE , 0.65 m2/ml, CIMBRA UNA CARA ACABADO COMUN, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML		139.20
IGS-003	LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADA CON VARILLA 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE; 21 BASTONES DE 1.2 MTS. EN LADO CORTO Y 26 BASTONES DE 1.00 MTS. EN EL LADO LARGO, CONSIDERANDO AFINE. COMPACTACIÓN CON BAILARINA DE LA SUPERFICIE, SEPARADORES PARA EL ACERO DE REFUERZO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO, INCLUYE; PRUEBAS DE LABORATORIO Y VIBRADOR	M2		160.00
ALBAÑILERIAS				
MUR-016	MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM EN 12 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4 CON JUNTAS DE 1.5 CM PROMEDIO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2		296.80
CAS-014	CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 15 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4" REFORZADO CON ARMEX 12X 12-4 CM, INCLUYE; CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M		163.20
CAD-028	CADENA DE CERRAMIENTO CON UNA SECCIÓN DE 12 X 20 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. T.M.A. 3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 12x20-4, INCLUYE; CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M		140.16
LOS-004	LOSA MACIZA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFORZADA CON 6.945 KGS/M2 DE VARILLAS DE 3/8" CONSIDERANDO: BASTONES, COLUMPIOS Y LARGAS EN AMBOS SENTIDOS COMO SE INDICA EN PLANO INCLUYE; CIMBRA APARENTE CON CIMBRAPLAY DE 16 MM. DE CONTACTO Y DE SOPORTE, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, TUINO PERIMETRAL EN GOTERO Y CHAFLAN.	M2		257.92
CIMB-006	CIMBRA APARENTE EN FRONTERA DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML		182.40
IMP-001	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y AISLANTE TÉRMICO IMPER PASA 802 EN AZOTEA, INCLUYE; 2 MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2		257.92
BANQ-004	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE 8 CM DE ESPESOR ANCHO PROMEDIO DE 0.60 CMS., ACABADO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR EN LAS ORILLAS, INCLUYE; DENTELLON DE 10 X 12 CMS., CEMENTO, VOLTEADOR, CURADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML		36.16833
LMB-001	EMBOQUILLADO EN MURÓS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CFM-ARE. 1:4 DE 12 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE; PERFILADO DE DOS ARISTAS.	M		111.68
CANCELERÍA				
VENTAL-001	VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 120X100 CM, HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA		16.00
PUERT-001	PUERTA DE HERRERÍA DE 2.13 X 0.90M MEDIDA TOTAL A BASE DE PERFILES PINTRO CAL. 20, INCLUYE; MARCO, TABLERO ACANALADO EN LA PARTE INFERIOR, CRISTAL DE 6MM EN LA PARTE SUPERIOR, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILIPS MODELO 715 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, PRIMARIO, ACABADO CON 2 APLICACIONES DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 COLOR BLANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, VER DETALLES EN PLANO.	PZA		8.00
INSTALACIÓN ELECTRICA				
INSE-024CD	ALIMENTADOR ELECTRICO CON CABLE DEL THW-CAL. 10 DOS HILOS INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN	M		96.00




COPOZA, S.A DE C.V.
 CALLE CHIHUAHUA No. 103, COL. MEXICO POZA RICA. VERACRUZ.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

INSE-023CD	MUFA 3/4" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, NIPLÉ 0.30 mts. X 3/4", MUFA SECA DE 3/4", ABRAZADERA DE 3/4", AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE PARA REMATE DE ACOMETIDA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	Pza		8.00
INSE-022CDA	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MARCA SQUARE-D O SIMILAR QOD4F CON TAPA TIPO EMPOTRAR, INCLUYE 2 INTERRUPTORES TERMO-MAGNÉTICOS TIPO QO DE UN POLO CON CAPACIDADES DE 15 Y 20 AMP RESPECTIVAMENTE A 10,000 AMP. RMS., INCLUYE CABLEADO Y CONEXIONES.	Pza		8.00
INSE-027CD	VARILLA COPERWELD DE 3/8" Ø Y 1.50 M. DE LONGITUD, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CONECTOR MECANICO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	Pza		8.00
INSE-026CD	SALIDA DE CENTRO, INCLUYE; FOCO AHORRADOR LUZ BLANCA 25 W, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLEADO, CABLE DE COBRE CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL.14,CAJA REGISTRO 4"X4" GALVANIZADA, CAJA CHALUPA, SOQUET DE PORCELANA DE 4", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO "CUARTOS DORMITORIOS".	Salida		32.00
INSE-021CD	APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS E260110 A127 VOLTS. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	Pza		16.00
INSE-025CD	SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCADO, CABLEADO, POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM Ø, CABLE #12, CABLE DESNUDO #12, CAJA CHALUPA GALVANIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO "CUARTOS DORMITORIO".	Salida		16.00
INSE-020CD	CONTACTO MONO FASICO POLARIZADO DUPLEX MCA BTICINO O SIMILAR LINEA MODUS 2P+T E6028N. INCL. TAPA DE PLASTICO COLOR MARFIL, CONEXIÓN, PIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	Pza		16.00
	LIMPIEZA			
IIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	m2		257.92

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., FUERON LAS QUE SE RELACIONAN EN SIGUIENTE:

No. DE ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MONTO
EST 01 (UNO PARCIAL)	20/10/2016	30/09/2016	19/10/2016	\$ 237,424.07
EST 02 (DOS) FINIQUITO	14/11/2016	20/10/2016	13/11/2016	\$ 391,795.54
			TOTAL EJERCIDO (C/IVA)	\$ 629,219.61
			SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA	\$ -
			MONTO CONTRATADO (C/IVA)	\$ 629,219.61



COPOZA, S.A DE C.V.
CALLE CHIHUAHUA No. 103, COL. MEXICO POZA RICA. VERACRUZ.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN


LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER. DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREEDOR A ALGUNA SANCIÓN ECONÓMICA.

QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I. V. A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACION, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADÉNDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAM, VER.

EL ARQ. CÉSAR MANUEL JUÁREZ CHÍMAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA EL DÍA **13 de noviembre de 2016** QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAM, VER., RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DE CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE **COPOZA, S.A DE C.V.**
REPRESENTADA POR EL **LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS** EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER

CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA **15 de noviembre de 2016**
LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.




LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS
APODERADO LEGAL DE COPOZA S.A DE C.V.

POR LA EMPRESA




ING. FERNANDO MARTÍNEZ RIVERA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ARQ. CÉSAR MANUEL JUÁREZ CHÍMAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. JUAN MANUEL ROMERO CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRAS



LIC. ANA ALICIA PERÉZ DÍAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
