



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION

EN LA QUE SE CONFIRMA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN A QUE SE REFIERE EL CONTRATO:

No. DE CONTRATO:	DOP_2020301890034_FISMDF_AD_002_C003
FECHA:	19 DE MAYO 2020 ✓

CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ, REPRESENTADO POR EL ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, **DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**, ING. JUZIEL EMILIO RAMIRO TORRES, **SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS**, C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA, **CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL** Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA IT PETROL S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL L.C. JAIME GONZALEZ CORONA, EN SU CALIDAD DE **REPRESENTANTE LEGAL**.



EN LA CIUDAD Y PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 30 DE JULIO DE 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE TUXPAN, VER., UBICADAS EN LA AV. JUAREZ NO 85 COL. CENTRO TUXPAN (TUXPAN) C.P. 92875.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENE SE MENCIONA AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO, PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LA OBRA:	"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL CEDRO, ENTRE LA CALLE DEL PUENTE Y LA CALLE EL HIGO, COL. LAS DELICIAS"
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01 DE JUNIO DE 2020
FEHCA DE INICIO REAL:	01 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	30 DE JULIO DE 2019
FECHA DE TERMINACION REAL:	30 DE JULIO DE 2019
PLAZO EN DIAS:	60 DIAS
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 623,919.92
MONTO DEL CONVENIO:	\$0.00
MONTO EJERCIDO:	\$ 623,919.92

LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES EJECUTADOS EN LA OBRA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	Total Estimado
			Cantidad
GYB	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
PR	PRELIMINARES		
LDI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA ✓	1.00 ✓
TALA-020	TALA DE ÁRBOL POR MEDIOS MECANICOS DE 20 - 30 CM DE DIÁMETRO HASTA 3.50 MT DE ALTURA, INCLUYE; CORTE, JUNTA, DESENRAICE, CARGA Y ACARREO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1 KM, DONDE LA SUPERVISION INDIQUE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA ✓	4.00 ✓
RENIV-101580	RENIVELACION DE 10 A 15 CMS. DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE HASTA 80 X 80 CMS. MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE LA REGION 7 X 14 X 28 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA ✓	14.00 ✓
ALB-0185	ESCALON DE 35 CMS. DE HUELLA Y 18.5 CMS. DE PERALTE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4". INCLUYE; TRAZO, FORJADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M ✓	1.35 ✓
GYB	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
TRAZ-003	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2 ✓	831.28 ✓
EXC-005	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO B DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3 ✓	185.59 ✓
GUAR-003	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x20x50 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M ✓	494.96 ✓
GUAR-009	GUARNICION DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15x25x70 CMS, REFORZADA CON 4 Ø DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" Ø @ 20 CMS., INCLUYE: CIMBRADO APARENTE Y DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX @ 15 m y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M ✓	13.35 ✓
RELL-001	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90% POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	M3 ✓	84.30 ✓
RELL-021	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL INERTE EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90% PROCTOR, INCLUYE; ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3 ✓	60.31 ✓
BANQ-003	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" DE 8 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO Y A VOLTEADOR, INCLUYE: ADITIVOS RETARDANTES DE FRAGUADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, JUNTA DE CELOTEX Y CALAFATEO @ 20 MTS., JUNTAS FRÍAS EN SENTIDO TRANSVERSAL @ 2.50 MTS P.U.O.T.	M2 ✓	660.63 ✓
CYA-005	CARGA Y ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN CAMIÓN VOLTEO, INCLUYE; CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL	M3 ✓	138.76 ✓
CYA-004	ACARREO A KILOMETRO SUBSECUENTE AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM ✓	555.04 ✓




ITPETROL

PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, CON 30 CMS. DE DESARROLLO MINIMO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	494.96
LOGO-DO1	ROTULO EN RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CON PINTURA DE ESMALTE COLORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	4.00
AFIN-002	AFINE Y COMPACTACION DE SUBRASANTE AL 90% PROCTOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AGUA, EQUIPO, LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, OPERACIÓN, P.U.O.T.	M2	2,106.58
LIM-001A	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	831.28
-	EXTRAORDINARIOS		
EXTR-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO DE 0.75 X 0.75 A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F ^c =150 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2"X1/8", EN BANQUETA DE 8 CM, INCLUYE: VARS 3/8", SOLDADURA, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE P.U.O.T.	PZA	14.00
EXTR-02	CORTE CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO II EN SECO HASTA ALCANZAR NIVEL SUBRASANTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	7.325
EXTR-03	REVESTIMIENTO CON MATERIAL CACAJO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T,	M3	29.02773

LAS ESTIMACIONES APROBADAS POR EL MUNICIPIO DE TUXPAN, VER. FUERON LAS QUE SE RELACIONAN ENSEGUIDA:

N° DE ESTIMACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MONTO
EST 01 (UNO) NORMAL	01 DE JUNIO DE 2020	30 DE JUNIO DE 2020	\$ 319,104.69
EST 02 (DOS) NORMAL	01 DE JULIO DE 2020	14 DE JULIO DE 2020	\$ 231,054.10
EST 3 (TRES) FINIQUITO	15 DE JULIO DE 2020	30 DE JULIO DE 2020	\$ 73,761.13


LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, DECLARAN QUE EL CONTRATISTA, NO SE HIZO ACREDOR A ALGUNA SANCION ECONOMICA. QUEDA ASENTADA EN LA PRESENTE ACTA, QUE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS EQUIVALENTE AL 10 % DEL MONTO TOTAL EJERCIDO INCLUYENDO EL I.V.A., PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN, SE ENCUENTRA EN TRÁMITE POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA CUAL DEBERA DE SER PRESENTADA AL MOMENTO DE FINIQUITAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SER ANEXADA A ESTA ACTA MEDIANTE ADENDUM, FECHA EN LA QUE SE CONSIDERA COMO LA FORMAL ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, VERACRUZ.

EL ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, PERSONALMENTE CONSTATÓ QUE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO FUE TOTALMENTE TERMINADA AL 100% EL DIA **JUEVES 30 DE JULIO DE 2020** QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER.


POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA IT PETROL S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL L.C. JAIME GONZALEZ CORONA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL., MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER.


CON LO ANTERIOR, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DÍA **30 DE JULIO DE 2020** LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

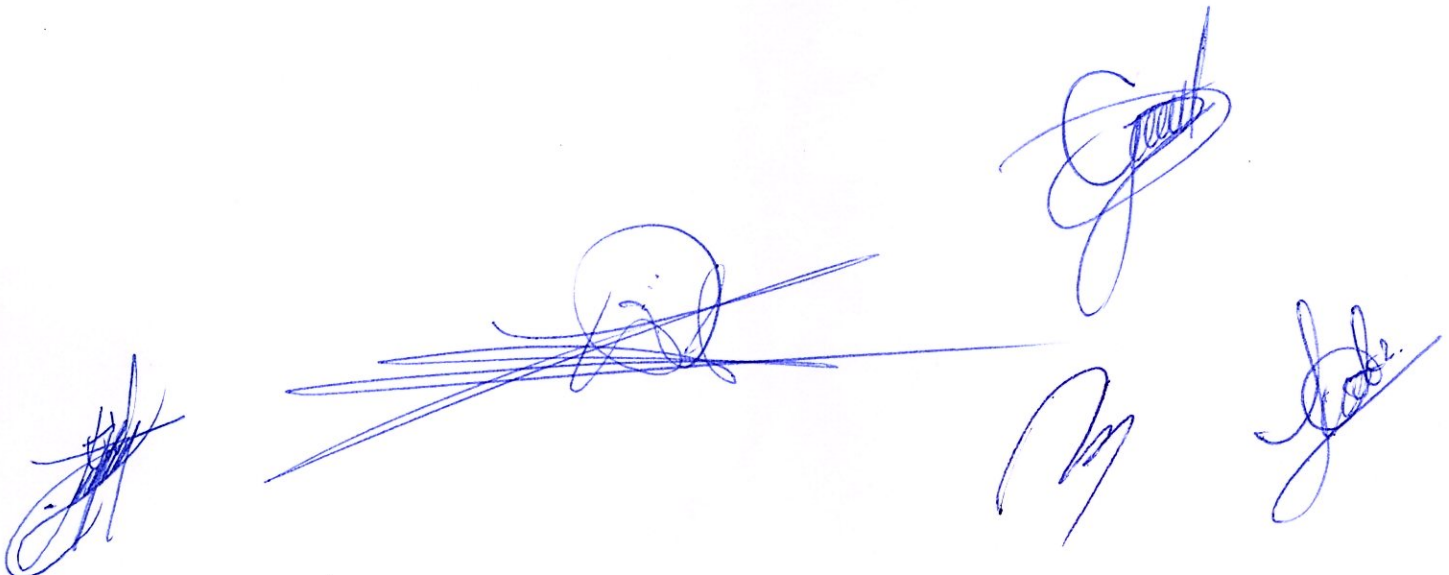

POR LA EMPRESA




L.C. JAIME GONZALEZ CORONA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. PASQUAL CORTES CORTES
RESIDENTE DE OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO



ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL ANGEL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. JUZIEL EMILIO RAMIRO TORRES
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



C.P. MARIO ZABDIEL SAUCEDO BONILLA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
