



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CONVENIO No. 01 (UNO)

AL CONTRATO No.

***DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100***


CONVENIO No. 02 (DOS) AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. ***DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100***, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TUXPAN Y/O MUNICIPIO DE TUXPAN, REPRESENTADO POR LOS C.C. LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL LIC. JAVIER BENITEZ PONCE, SINDICO UNICO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA/PERSONA FÍSICA: **COPOZA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL Y CON EL VISTO BUENO DEL C. ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO, SE LES DENOMINARÁ, "EL CONTRATISTA" Y "EL AYUNTAMIENTO", RESPECTIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**DECLARACIONES:**

I).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" CON FECHA **29 DE AGOSTO DE 2017** DEL PRESENTE AÑO, FIRMARON EL CONTRATO No. ***DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100*** PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "***MEJORAMIENTO DE OCHO AULAS EN LA ESC. BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS.***", EN EL MUNICIPIO DE TUXPAN., VERACRUZ

CON UN MONTO DE \$524,159.11 ( QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **30** DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y DE TERMINACIÓN EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO  
CONTRATO  
*DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100***

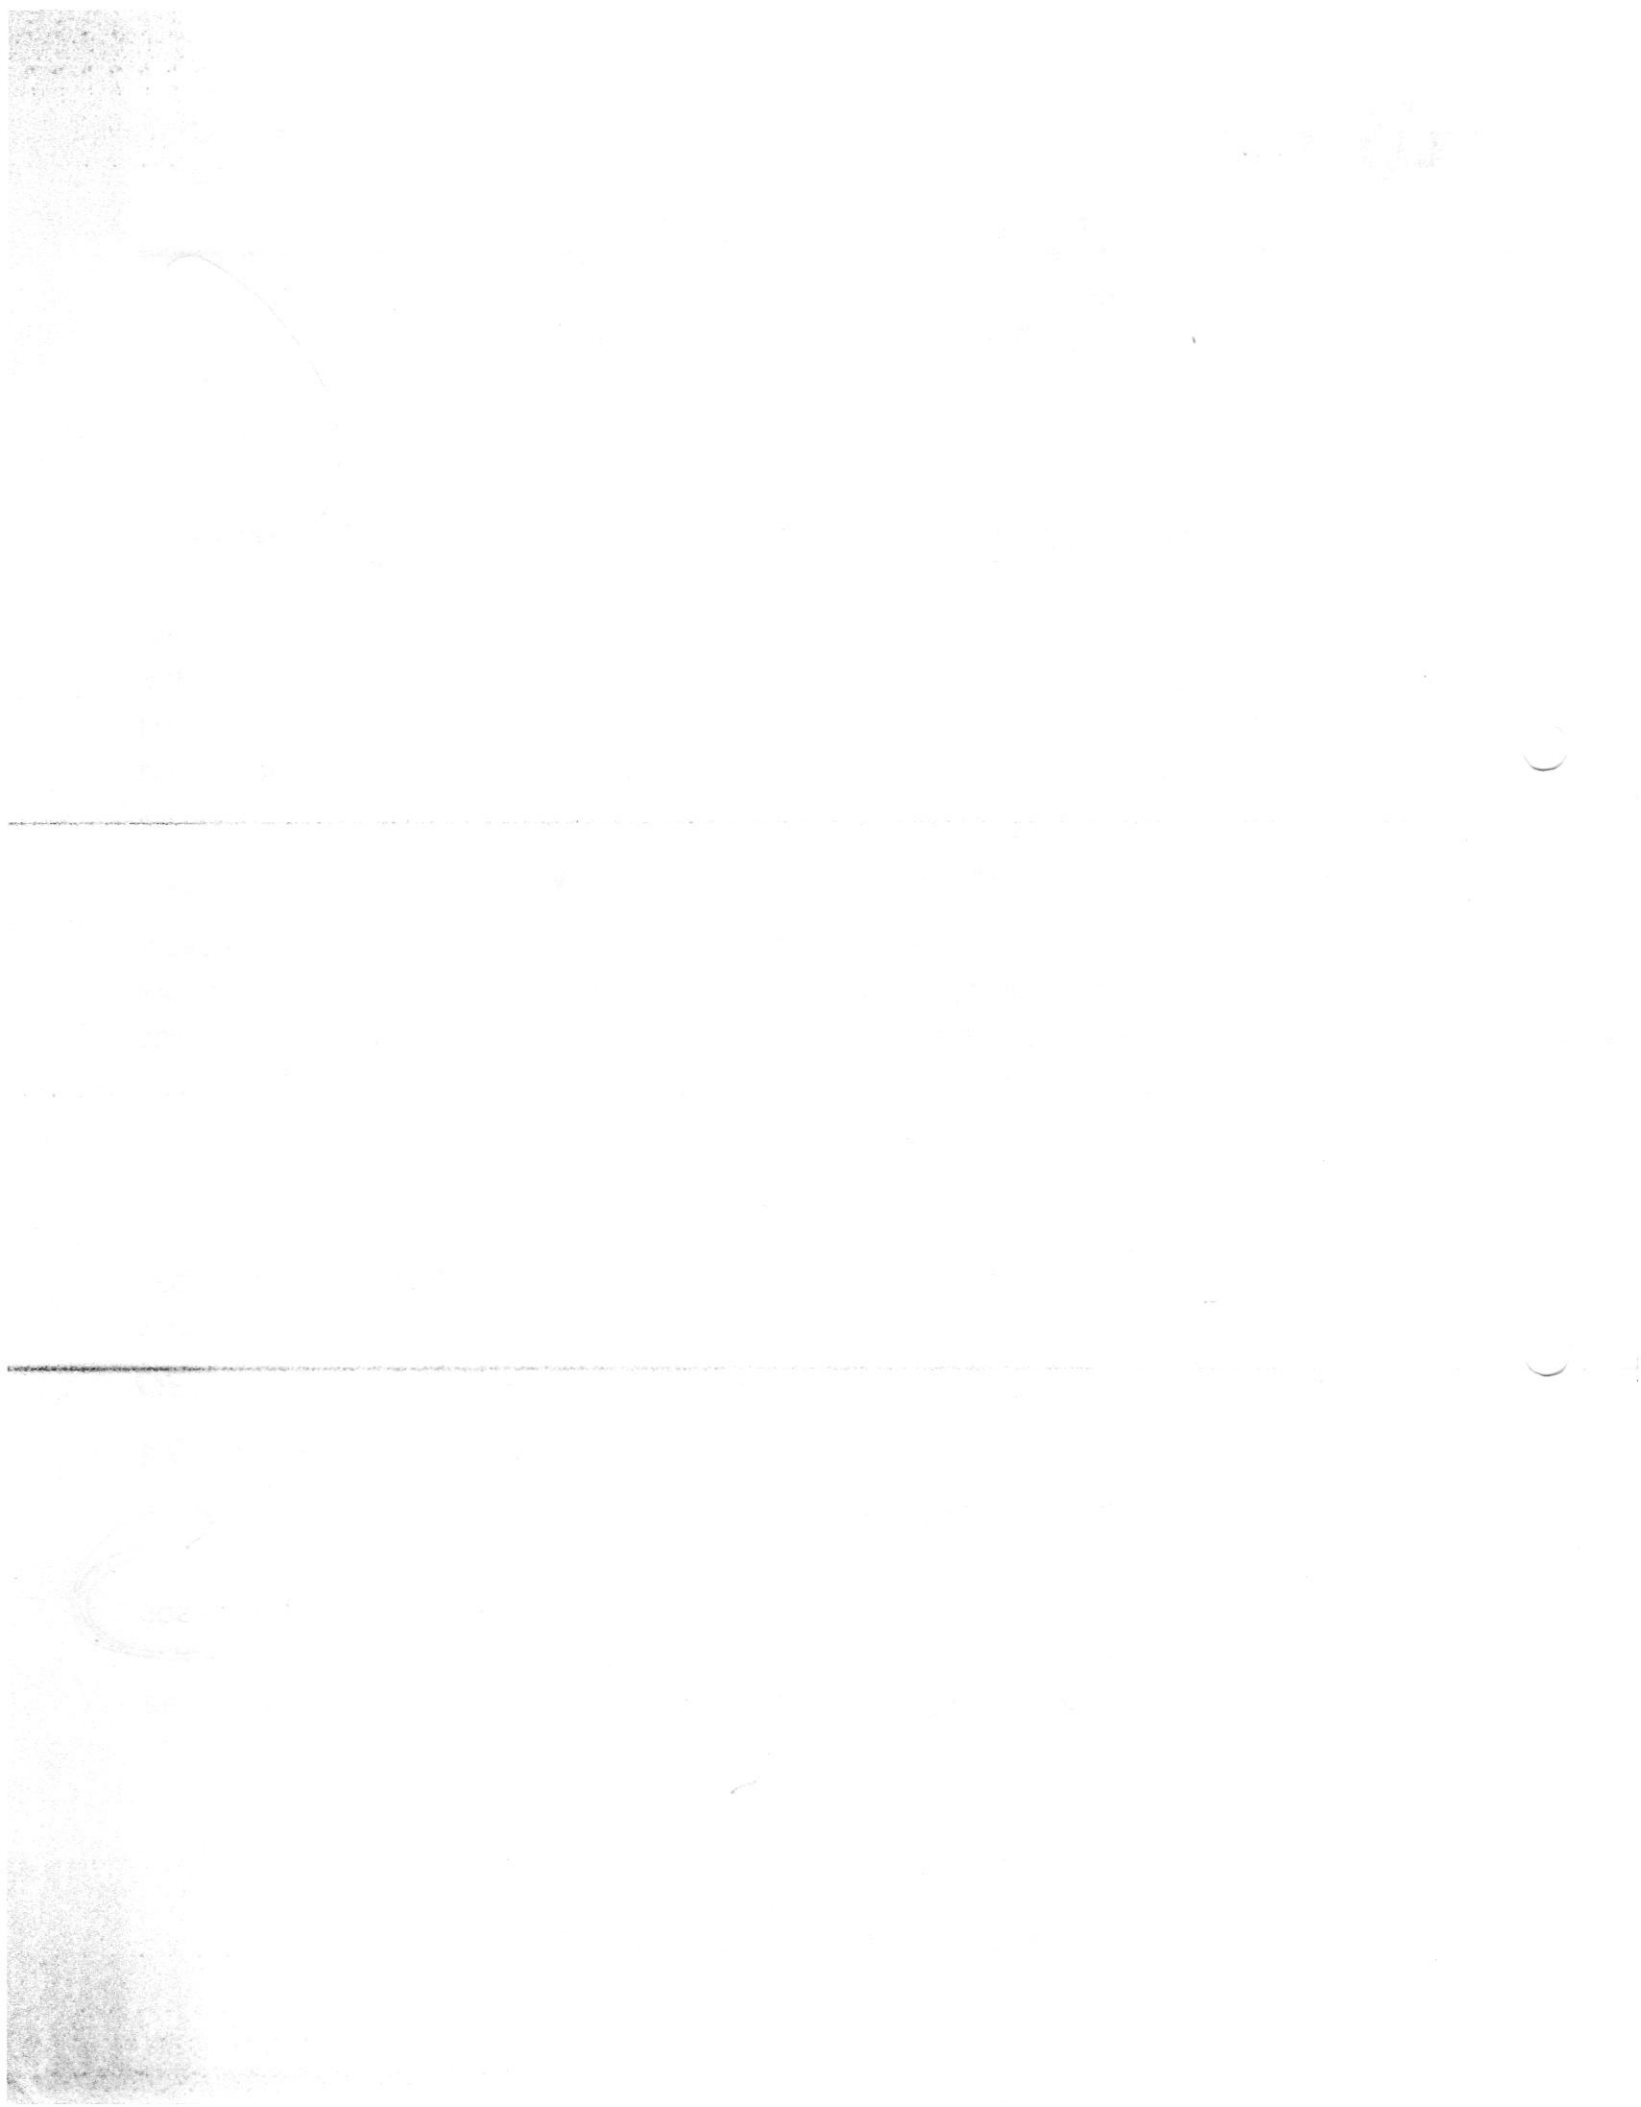



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

II).- EN APEGO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA PARRAFO II DEL CONTRATO EN CUESTIÓN, ASI COMO EL ARTICULO 59 DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN VIGOR, LOS ENTES PUBLICOS PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONSTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, MEDIANTE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE LEY.

ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVERTIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

III).- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA" DECLARAN QUE ESTE CONVENIO SE REALIZA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

SE DETERMINÓ LA AUTORIZACION DEL CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR **DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**, PROPUESTO POR EL "CONTRATISTA" DEL DIA **22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017 ( 30 DIAS) NATURALES;**

ESTE CONVENIO SE SUJETA A LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

PRIMERA.- AMPLIACION AL PLAZO.- EL PLAZO DE EJECUCION SE DIFIERE EN VIRTUD DE QUE EN LA

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO  
CONTRATO  
DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A EL ANTICIPO QUE SE OTORGA A "EL CONTRATISTA" POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO), EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$157,247.73 ( CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION, EL CUAL FUÉ PAGADO A LA EMPRESA CONTRATISTA EL DIA **21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

DERIVADO DEL ANTICIPO NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA, "EL CONTRATISTA" SOLICITA MEDIANTE OFICIO MEMBRETADO DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 (ANEXO I), LA ELABORACION DEL PRESENTE CONVENIO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EXPRESADA EN EL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA: "*MEJORAMIENTO DE OCHO AULAS EN LA ESC. BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS.*", ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL TRASPASO EFECTUADO POR TESORERIA MUNICIPAL (ANEXO II), ASI TAMBIEN ENTREGA LA REPROGRAMACION DE LA OBRA EN MENCION (ANEXO III), POR EL CUAL SURGE LA NECESIDAD DE LA ELABORACION DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA TERMINADA AL 100% DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO EN EL PRESENTE CONVENIO.

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO  
CONTRATO  
DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL Y DE CONVENIOS RELATIVOS AL MISMO QUEDAN VIGENTES, A EXCEPCION DE LO QUE EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

**POR EL AYUNTAMIENTO**



LIC. RAUL ALBERTO RUIZ DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



LIC. JAVIER BENITEZ PONCE  
SÍNDICO UNICO

**EL CONTRATISTA**




COPOZA, S.A. DE C.V.  
LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS  
APODERADO LEGAL

Vo. Bo.



ARQ. CESAR MANUEL JUAREZ CHIMAL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO  
CONTRATO  
DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100**





**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS**

---

**CONVENIO DE CORRIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION  
POR DIFERIMIENTO DEL ANTICIPO**

**ANEXO I**

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO  
CONTRATO  
DOP\_2017301890100\_FIS MDF\_AD\_053\_C100**



Oficio No. 2017301890100/01  
Tuxpan, Ver. A 21 de Septiembre de 2017.

**Arq. Cesar Manuel Juárez Chimal.**

Director de Obras Publicas del Municipio de Tuxpan.  
Presente:

**At'n. Ing. Alberto Emmanuel Solano Huerta.**  
Supervisión Externa

Referente al contrato No. **DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100**, de fecha 29 de agosto de 2017, relativo a la obra "**MEJORAMIENTO DE OCHO AULAS EN LA ESC. BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS**" en la localidad de Santiago de la Peña, del municipio de Tuxpan, Ver.

Por este medio y bajo el amparo de la clausula octava.- anticipos, del contrato que tenemos celebrado y al art. 58 de la Ley numero 825 de Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en el fracción I menciona:

**I. "El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. El otorgamiento del anticipo, podrá realizarse en una sola exhibición, o en varias parcialidades, en casos excepcionales"**

Al respecto le informamos que con fecha 21 de Septiembre de 2017 nos fue otorgado el anticipo correspondiente al 30% del monto del contrato por un importe de \$ 157,247.73 (Ciento cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y siete pesos 73/100 M.N.) incluido el I.V.A.

Razón por la cual le que solicitamos se realice el convenio por diferimiento sin modificar en plazo el programa de ejecución pactado, anexando:

- Copia de la Caratula de Contrato
- Copia del estado de cuenta donde se refleja el depósito realizado.
- Programas diferidos para su revisión y en su caso aprobación.

Proponiendo el siguiente periodo, como el nuevo periodo por diferimiento de pago de anticipo:

Fecha de inicio diferido: **22 de septiembre de 2017.**

Fecha de término diferido: **21 de octubre de 2017.**

Sin más por el momento quedo a sus órdenes aprovechando la ocasión para reiterarle mi admiración y respeto.

**Atentamente.**

  
**Lic. Narciso Armando Uresti Villegas**  
Apoderado legal

c.c.p. Arq. Anselmo Meza Hernández.-Supervisor de obra



# **ANEXO II**

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO  
CONTRATO  
DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100**



Le informamos que le fue enviada una Transferencia interbancaria a cuenta de cheques/ahorro, bajo las siguientes condiciones.

Titular de la cuenta de retiro  
Banco Destino  
Cuenta de depósito  
Nombre del beneficiario  
Importe  
Fecha de operación  
Forma de depósito  
Concepto de pago  
Folio Internet

MUNICIPIO DE TUXPAN  
SCOTIABANK  
\*\*\*\*\*3582  
COPOZA S.A DE C.V  
\$ 157,247.73  
21 de Septiembre de 2017, 11:11:31 AM  
MISMO DÍA (SPEI)  
PAG.ANT.OBRA2017301890100FISM 54-A  
8643869282

**MENSAJE:**

HA YTO DE TUXPAN ENVIA COMPROBANTE DE PAGO POR ANTICIPO OBRA  
2017301890100 FISM FACT. 54-A

---



# **ANEXO III**

**CONVENIO 01 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO  
CONTRATO  
DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100**



AD-T-9.1

REPROGRAMACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

OIBRA No.: 2017301890100

FECHA: 21/09/2017

PLAZO: 30


HOJA: 1/6

DESCRIPCION: MEJORAMIENTO DE OCHO AULAS EN LA ESC. BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS.

EMPRESA O PERSONA FISICA: COPOZA, S.A. DE C.V.

CONTRATO: DOP\_2017301890100\_FIS MDF\_AD\_053\_C100

ETAPAS Y CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	sep.-2017	oct.-2017
<b>MEJORAMIENTO ESC. PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ</b>		<b>1.00</b>	22/sep./2017	21/oct./2017	[Gantt bar spanning from 22/sep to 21/oct]	
<b>PRELIMINARES</b>		<b>1.00</b>	22/sep./2017	22/sep./2017	[Gantt bar at 22/sep]	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE BASTIDOR METÁLICO TUBULAR ZINTRO GALV. DE 1". CON LONA DE 1.00X1.50 M DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	pza	1.00	22/sep./2017	22/sep./2017	1.00	
<b>EDIFICIO 2</b>		<b>1.00</b>	22/sep./2017	21/oct./2017	[Gantt bar spanning from 22/sep to 21/oct]	
<b>PRELIMINARES</b>		<b>1.00</b>	22/sep./2017	24/sep./2017	[Gantt bar at 22/sep]	
DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA DE HERRERIA PUERTAS, VENTANAS Y PROTECCIONES HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M., INCLUYE; DESMONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO A 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA PARA SU RESGUARDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	47.37	22/sep./2017	24/sep./2017	47.37	
<b>CANCELERIA</b>		<b>1.00</b>	30/sep./2017	09/oct./2017	[Gantt bar spanning from 30/sep to 09/oct]	
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 20X100 CM, HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	41.37	30/sep./2017	09/oct./2017	4.14	37.23

  
 LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS  
 APODERADO LEGAL



**AD-T-9.1**

**REPROGRAMACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

**DESCRIPCION:** MEJORAMIENTO DE OCHO AULAS EN LA ESC. BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS.

**OBRA No.:** 2017301890100

**FECHA:** 21/09/2017

**PLAZO:** 30

**HOJA:** 2/6

**EMPRESA O PERSONA FISICA:** COPOZA, S.A. DE C.V.

**CONTRATO:** DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100

ETAPAS Y CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	Gantt Chart	
					sep.-2017	oct.-2017
PUERTA DE MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.50M CON MARCO DE ALUMINIO Y FIJO DE 90 X 40 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	4.00	30/sep./2017	09/oct./2017	0.40	3.60
PROTECCION DE HERRERIA A BASE DE CUADRADO DE 1/2" @ 15 CMS., MARCO DE ANGULO DE 1" X 1/8" Y REFUERZO HORIZONTAL DE SOLERA DE 1" X 1/8", UNA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS APLICACIONES DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: COLOCACION, ANCLAJE MEDIANTE CUADRADO DE 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	47.52	30/sep./2017	09/oct./2017	4.75	42.77
<b>ACABADOS</b>		<b>1.00</b>	<b>23/sep./2017</b>	<b>17/oct./2017</b>	[Gantt bar for 1.00 units from 23/sep to 17/oct]	
EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE. 1:4 DE 1/2 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE PERFILADO DE DOS ARISTAS.	m	93.95	23/sep./2017	02/oct./2017	75.16	18.79

  
 LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS  
 APODERADO LEGAL



**AD-T-9.1**

**REPROGRAMACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

**OBRA No.:** 2017301890100

**FECHA:** 21/09/2017

**PLAZO:** 30

**HOJA:** 3/6

**DESCRIPCION:** MEJORAMIENTO DE OCHO AULAS EN LA ESC. BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS.

**EMPRESA O PERSONA FISICA:** COPOZA, S.A. DE C.V.

**CONTRATO:** DOP\_2017301890100\_FIS MDF\_AD\_053\_C100

ETAPAS Y CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	sep.-2017	oct.-2017
PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA REAL FLEX INTERIORES Y EXTERIORES O SIMILAR EN CAFACTERICAS Y ESPECIFICACION APLICADA DOS APLICACIONES HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. EN MUROS COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO; INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	m2	328.73	13/oct./2017	17/oct./2017		328.73
<b>LIMPIEZA</b>		<b>1.00</b>	20/oct./2017	21/oct./2017		
LIMPIEZA DE VIDRIOS POR AMBAS CARAS CON DETERGENTE EN POLVO Y AGUA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE; ACARREO DE MATERIAL A 1ªRA. ESTACION DE 20 M., MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	82.74	20/oct./2017	21/oct./2017		82.74
LIMPIEZA DE PISO DE MATERIAL VIDRIADO CON DETERGENTE EN POLVO, AGUA Y ACIDO MURIATICO DILUIDO, INCLUYE; ACARREOS A PRIMERA ESTACION 20 M., MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	193.11	20/oct./2017	21/oct./2017		193.11
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	m2	262.37	20/oct./2017	21/oct./2017		262.37
<b>EDIFICIO 3</b>		<b>1.00</b>	25/sep./2017	21/oct./2017	■	
<b>PRELIMINARES</b>		<b>1.00</b>	25/sep./2017	27/sep./2017	■	

  
 LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS  
 APODERADO LEGAL



**AD-T-9.1**

**REPROGRAMACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

**OBRA No.:** 2017301890100

**FECHA:** 21/09/2017

**PLAZO:** 30

**HOJA:** 4/6

**DESCRIPCION:** MEJORAMIENTO DE OCHO AULAS EN LA ESC. BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS.

**EMPRESA O PERSONA FISICA:** COPOZA, S.A. DE C.V.

**CONTRATO:** DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100

ETAPAS Y CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	sep.-2017	oct.-2017
DESMANTELAMIENTO DE CANCELERIA DE HERRERIA PUERTAS, VENTANAS Y PROTECCIONES HASTA UNA ALTURA DE 2.50 M., INCLUYE; DESMONTAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO A 20 MTS. DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA PARA SU RESGUARDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	56.51	25/sep./2017	27/sep./2017	■ 56.51	
<b>CANCELERIA</b>		<b>1.00</b>	<b>05/oct./2017</b>	<b>14/oct./2017</b>		■ ■
VENTANA DE ALUMINIO CON MEDIDA 20X100 CM, HOJA CORREDIZA Y FIJO CON PERFILES DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MOSQUITERO, MATERIAL, CRISTAL CLARO 6 MM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	47.75	05/oct./2017	14/oct./2017		■ ■ 47.75
PUERTA DE MULTIPANEL LISA DE 0.90 X 2.50M CON MARCO DE ALUMINIO Y FIJO DE 90 X 40 CMS. EN LA PARTE SUPERIOR CON CRISTAL CLARO DE 6MM, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	5.00	05/oct./2017	14/oct./2017		■ ■ 5.00

  
 LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS  
 APODERADO LEGAL



**AD-T-9.1**

**REPROGRAMACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

**OBRA No.:** 2017301890100

**FECHA:** 21/09/2017

**PLAZO:** 30


**HOJA:** 5/6

**DESCRIPCION:** MEJORAMIENTO DE OCHO AULAS EN LA ESC. BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS.

**EMPRESA O PERSONA FISICA:** COPOZA, S.A. DE C.V.

**CONTRATO:** DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100

ETAPAS Y CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	sep.-2017	oct.-2017
PROTECCION DE HERRERIA A BASE DE CUADRADO DE 1/2" @ 15 CMS., MARCO DE ANGULO DE 1" X 1/8" Y REFUERZO HORIZONTAL DE SOLERA DE 1" X 1/8", UNA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS APLICACIONES DE ESMALTE COMEX 100 O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION, INCLUYE: COLOCACION, ANCLAJE MEDIANTE CUADRADO DE 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	56.26	05/oct./2017	14/oct./2017		56.26
<b>ACABADOS</b>		<b>1.00</b>	<b>25/sep./2017</b>	<b>17/oct./2017</b>		
EMBOQUILLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEM-ARE. 1:4 DE 1/2 A 15 CM DE ANCHO Y 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE PERFILADO DE DOS ARISTAS.	m	106.80	25/sep./2017	04/oct./2017	64.08	42.72
PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA REAL FLEX INTERIORES Y EXTERIORES O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACION APLICADA DOS APLICACIONES HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. EN MUROS COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO TERMINADO; INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	m2	373.17	13/oct./2017	17/oct./2017		373.17
<b>LIMPIEZA</b>		<b>1.00</b>	<b>20/oct./2017</b>	<b>21/oct./2017</b>		

  
 LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS  
 APODERADO LEGAL



**AD-T-9.1**

**REPROGRAMACION DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS**

**DESCRIPCION:** MEJORAMIENTO DE OCHO AULAS EN LA ESC. BELISARIO DOMINGUEZ, COLONIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS.

**OBRA No.:** 2017301890100

**FECHA:** 21/09/2017


**PLAZO:** 30

**HOJA:** 6/6

**EMPRESA O PERSONA FISICA:** COPOZA, S.A. DE C.V.

**CONTRATO:** DOP\_2017301890100\_FISMDF\_AD\_053\_C100

ETAPAS Y CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	sep.-2017	oct.-2017
LIMPIEZA DE VIDRIOS POR AMBAS CARAS CON DETERGENTE EN POLVO Y AGUA, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE; ACARREO DE MATERIAL A 1RA. ESTACION DE 20 M., MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	92.02	20/oct./2017	21/oct./2017		92.02
LIMPIEZA DE PISO DE MATERIAL VIDRIADO CON DETERGENTE EN POLVO, AGUA Y ACIDO MURIATICO DILUIDO, INCLUYE; ACARREOS A PRIMERA ESTACION 20 M., MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	238.94	20/oct./2017	21/oct./2017		238.94
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	m2	238.94	20/oct./2017	21/oct./2017		238.94

  
 LIC. NARCISO ARMANDO URESTI VILLEGAS  
 APODERADO LEGAL
